

Цифровые инструменты управления программами и проектами в госсекторе: практический опыт Липецкой области

2025



Содержание вебинара

- 01 О нас
- 02 Система управления программами и проектами
- 03 Примеры аналитики и отчетности
- 04 Технические особенности системы
- 05 Контакты

Докладчики



Андрей Некрасов

Руководитель отдела мониторинга национальных проектов РПО Липецкой области



Стратегическое управление и координация 42 региональных проектов в рамках национальных инициатив, а также 34 иных региональных и ведомственных проектов



Контроль за реализацией 533 объектов (в 2025 году), включая мониторинг сроков, объемов финансирования и выполнения ключевых этапов



Шамиль Мухаметдинов

Руководитель департамента платформенных решений



14 лет опыта внедрения информационно-аналитических и управляющих систем в государственном и корпоративном секторе



Сертифицированный специалист по продуктам «Форсайт. Аналитическая платформа» и Prognoz Platform



Более 50 реализованных проектов в роли специалиста, руководителя проекта, руководителя подразделения внедрения

О компании КРИТ

85%

Нашего дохода генерируют
постоянные клиенты

250+


Специалистов

200+

Реализованных проектов

Россия

Москва
Санкт-Петербург
Ижевск

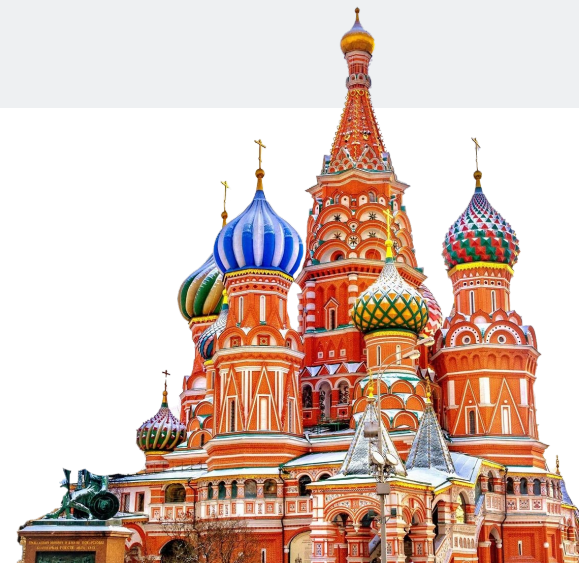

Армения

Ереван



Узбекистан

Ташкент



Саудовская Аравия

Эр-Рияд



Проектный опыт

Корпоративный сектор



Государственный сектор



- 01 О нас
- 02 **Система управления программами и проектами**
- 03 Примеры аналитики и отчетности
- 04 Технические особенности системы
- 05 Контакты

Проблематика

Согласно ежегодному отчету «Состояние проектного управления», опубликованному компанией Wellington Project Management:

29%

организаций завершают проекты
в установленные сроки

43%

способны укладываться
в бюджет

35%

довольны текущим уровнем
зрелости проектного управления

Правильно подобранная система управления проектами способствуют более точному и результативному координированию работы команды и достижению поставленных задач в условиях временных и ресурсных ограничений. Согласно исследованиям, проводимыми Институтом управления проектами (PMI):

на 38% больше проектов

у компаний с четкой структурой
управления проектами, которые
были завершены успешно
и достигли первоначальных целей

61% компаний

использующих ПО для управления
рабочими процессами, завершают
проекты вовремя. И только **41%**
организаций добивается тех же
результатов без использования
инструмента для реализации проектов

66% компаний

использующих систему для управления
проектами, не выходят за рамки
установленного бюджета. Только **47%**
организаций достигают такого же
результата без использования
специальных инструментов

Риски мегапроектов

90%

мегапроектов отклоняются от сроков и превышают бюджет по данным исследования PM Journal (*)



Сиднейский оперный театр был открыт **на 10 лет позже** плановой даты, затраты превысили смету в 14 раз (**)



Проект строительства магистрали «Big Dig» в Бостоне **превысил смету в 5 раз** (сметная оценка \$2,6 млрд, фактическая стоимость \$14,8 млрд)



(*) B. Flyvbjerg, "What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview," Project Management Journal 45, no. 2 (April-May 2014): 6-19; and A. Davies, M. Dodgson, and D.M. Gann, "Innovation and Flexibility in Megaprojects: A New Delivery Model," in "The Oxford Handbook of Megaproject Management," ed. B. Flyvbjerg (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2017), 313-338.



(**) The Sidney Opera House construction: A case of project management failure

Проблемы регионального проектного управления

1 Разрозненность источников информации о ходе проектной деятельности

2 Трудозатратный сбор отчетности с ответственных исполнителей о реализации мероприятий

3 Недоверие к данным: в источниках данных присутствуют противоречивые и неактуальные данные. При формировании аналитической отчетности требуются дополнительные трудозатраты на проверку данных

4 Ручное согласование данных

5 Большая часть нагрузки по ведению ложится на ответственного за проект, ограничения по подключению конкретных исполнителей


6 В «Электронном бюджете» планирование на практике ведется верхнеуровнево, крупными периодами, что не позволяет заблаговременно отследить срыв сроков работ

7 В «Электронном бюджете» нет возможности сформировать отчет по требованиям региона, расширить набор анализируемой информации (например, отчеты по запросам ИФНС, анализ по муниципалитетам)

Система управления программами и проектами

Основываясь на нашем опыте работы с государственным сектором и крупными предприятиями, мы разработали комплексное решение для управления национальными и промышленными проектами – **Система управления программами и проектами**

СУПП предоставляет **единое рабочее пространство** для управления крупномасштабными проектами, которое объединяет различные задачи проектного управления

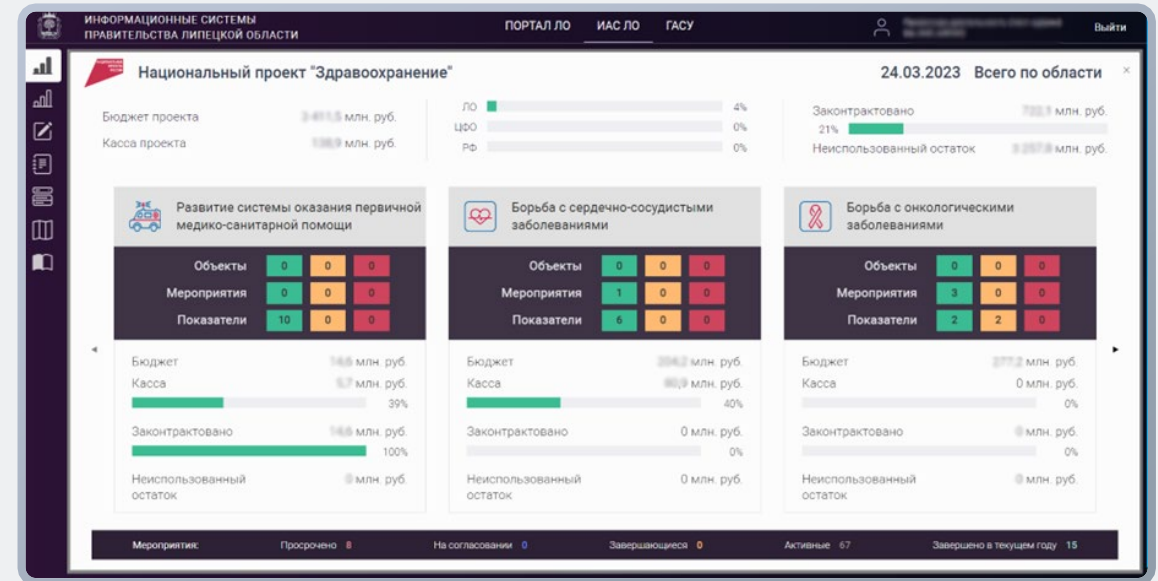

Решаемые задачи:



Формирование структуры проектов



Управление бюджетом и показателями проектов



Формирование отчетности



Аналитика для руководителей и участников проектной деятельности



Управление задачами и сроками



Согласование и контроль изменений



Хранение проектных документов

Пример Липецкой области



2022 Липецкая область

Система управления региональными проектами
в рамках Информационно-аналитической системы
Правительства Липецкой области

ИАС ЛО является набором экспертно-аналитических программных модулей, ориентированных на информационную и инструментальную поддержку учетной и аналитической деятельности руководства, специалистов Правительства области, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления



300+

пользователей



100+

проектов

(включая государственные
и муниципальные программы)

50+ в 2025



1500+

объектов и
мероприятий проектов

500+ в 2025



10000+

контрольных точек

3 000+ в 2025

Реализовано на базе
импортонезависимых,
кроссплатформенных и
Open Source технологий:

- ✓ КРИТ. Основные данные
- ✓ Форсайт. Аналитическая платформа
- ✓ СУБД Postgres Pro

Достижения и общественное признание

Лидер среди решений для государственного и муниципального управления
(ситуационные центры и центры принятия решения)

СУПП Липецкой области стала победителем в номинации «Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры принятия решения» на Всероссийский конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT 2023»

Всероссийский форум региональной информатизации



Проводится при поддержке
Администрации Президента
Российской Федерации



Одно из крупнейших событий
в сфере цифровизации
государственного управления



320+ проектов,
участвовавших в
конкурсе 2023



Участники из **60+**
регионов России



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Процесс проектного управления



Формирование структуры проектов *

- Результаты
- Показатели
- Объекты и мероприятия
- Контракты



Формирование планов-графиков работ по объектам

- Типовые планы-графики
- Планы-графики работ по каждому объекту



Планирование достижения показателей и бюджета проектов

- Финансовое обеспечение проекта
- Показатели эффективности проекта



Участники проектов



Оперативный мониторинг реализации проектов

- Исполнение контрольных точек
- Кассовое освоение проекта
- Фактическое достижение показателей



Аналитика для руководителей и участников проектов

- Дашборды
- Регламентная отчетность



Проектный офис

Бизнес-роли



Региональный проектный офис

- Добавление новых проектов, назначение ответственных, соисполнителей, наблюдателей
- Ведение настроечных справочников
- Согласование и контроль вносимых данных



Наблюдатель проекта

- Просмотр информации по назначенным проектам (с запретом внесения изменений)



Ответственный за проект

- Актуализация карточки проекта
- Ведение всех структурных элементов проекта (объекты, контракты, планы-графики работ)
- Контроль и согласование отчетов соисполнителей



Соисполнитель проекта


- Ведение информации по проекту в части, относящейся к ведомству соисполнителя (муниципалитет или орган власти)
- Предоставление отчетности по проектам



Возможности системы


Формирование структуры проектов

- Регистрация нового проекта
- Ведение атрибутов проекта (тип проекта, сроки реализации, перечень ответственных лиц и исполнителей)
- Ведение результатов, на достижение которых направлен проект
- Ведение показателей проекта
- Ведение объектов и мероприятий проекта
- Ведение контрактов, заключенных в рамках проекта

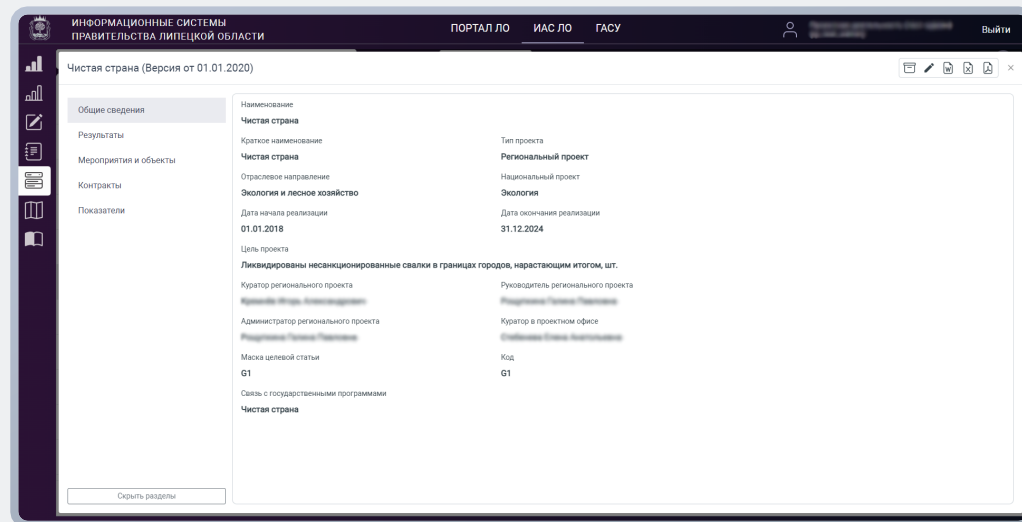


Формирование планов-графиков работ по объектам

- Формирование и согласование календарного плана работ по объектам
- Формирование типового шаблона плана-графика работ в зависимости от типа объекта
- Загрузка плана-графика из шаблона
- Настройка связей между контрольными событиями
- Визуализация календарного плана в виде диаграммы Ганта

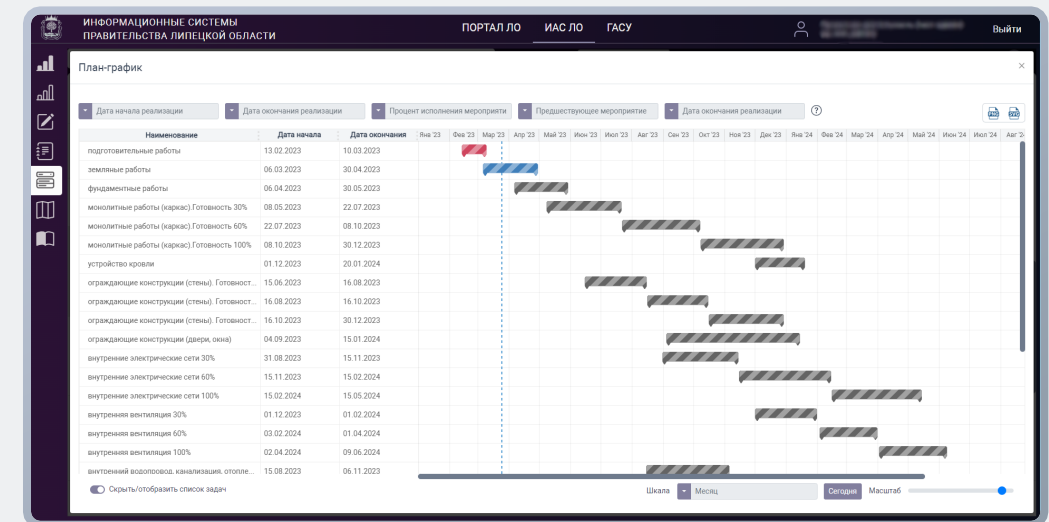


Планирование достижения показателей и бюджетов проектов

- Краткосрочное (помесячное) и среднесрочное (на 3 года) планирование финансового обеспечения проектов
- Детализация финансового обеспечения проектов до уровня отдельных объектов и мероприятий
- Краткосрочное и среднесрочное планирование достижения показателей проектов
- Согласование плановых значений проектным офисом

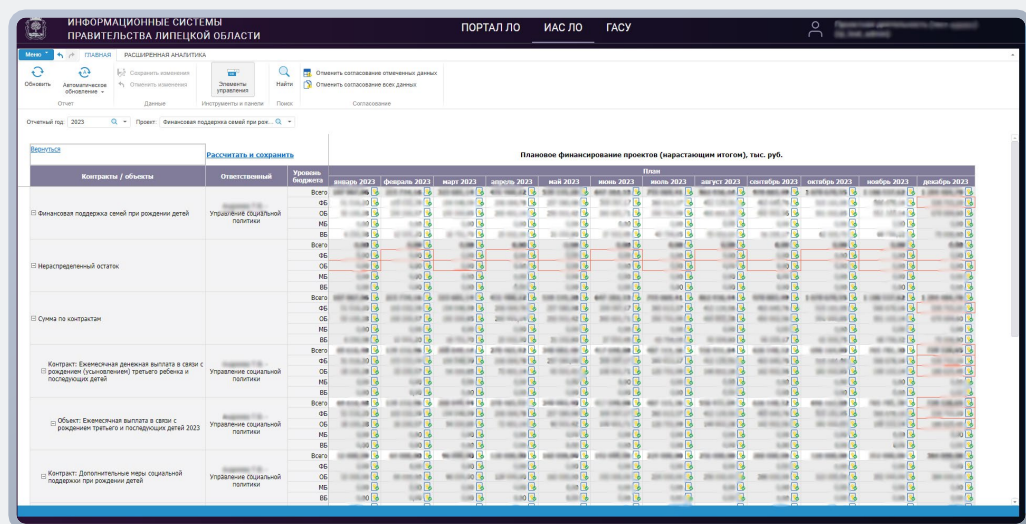

Оперативный мониторинг реализации проектов

- Ежедневный мониторинг и согласование исполнения контрольных точек планов-графиков работ по объектам
- Хранение документов, подтверждающих выполнение работ
- Ежемесячный мониторинг фактического достижения показателей проектов
- Еженедельный мониторинг финансового обеспечения проектов

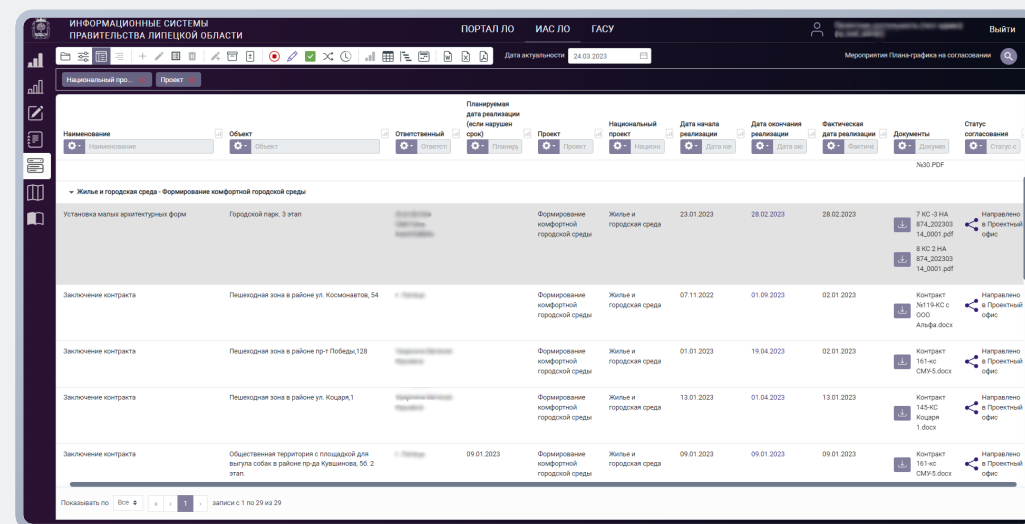

- Формирование сводной аналитической отчетности по проектам с выделением проблемных зон (исполнение календарного плана и показателей, контрактация и кассовое освоение)
- Формирование аналитических представлений по отдельным органам власти и муниципальным образованиям

- Формирование форм регламентной отчетности (финансирование в разрезе уровней бюджетов, отчеты для налоговой службы)
- Формирование пользовательской и геоаналитики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОРТАЛ ЛО ИАС ЛО ГАСУ

Выйти

Контракты и прочие финансирование

Сортировать настраивать

Доступные поля: Сумма, Средние, Обыкновенные, Количество, Колонки, Минимальные, Максимальные

Сроки: Проект, Заключен контракт, Закупка завершена, Запланировано, Проводятся конкурсные процедуры, нет данных

Факты в заголовке: ИМДК / планируемое финансирование, тыс. руб., Сумма контракта, тыс. руб.

Проект	Заключен контракт	Закупка завершена	Запланировано	Проводятся конкурсные процедуры	нет данных
общественного здоровья	ИМДК / планируемое финансирование, тыс. руб.	Сумма контракта, тыс. руб.	ИМДК / планируемое финансирование, тыс. руб.	Сумма контракта, тыс. руб.	ИМДК / планируемое финансирование, тыс. руб.
Успех каждого ребенка	107100	100000	0	0	0
Финансовая поддержка семей при рождении детей	0	0	0	0	1000000
Формирование комфортной городской среды	100000000	10000000	10000	10000	0
Цифровая культура	0	0	0	0	1000000
Цифровая образовательная среда	100000000	10000000	0	0	0

Возможности системы

Формирование отчетности по проекту

- Настройка сроков предоставления отчетности
- Настройка маршрута согласования отчетов
- Форматно-логический контроль вводимых данных
- Контроль предоставления данных пользователями

Дашборды для участников проектной деятельности

- Комплексная оценка хода реализации проектов
- Индикация проблемных зон
- Детализация информации по неисполненным мероприятиям и показателям
- Детализация информации по органам власти и муниципальным образованиям

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОРТАЛ ЛО ИАС ЛО ГАСУ


Меню Настройка отчетов Расширенная аналитика

Обновить Автоматическое обновление Отчет Данные Инструменты и панели Поиск

Отчетный год: 2023

Финансирование проектов. Контроль предоставления данных

Проект	Исполнитель	Роль в проекте	Статус	Дата последнего изменения	Нормативный, высший приоритет	Дата начала сбора	Срок предоставления
Демонстрация	Финансовая поддержка семей при рождении детей	Управление здравоохранения	Отвественный	20.03.2023 17:26	Согласовано	01.01.23 00:00	03.03.23 23:59
Финансовая поддержка семей при рождении детей	Управление социальной политики	Отвественный	Согласовано	20.03.2023 17:28	Согласовано	01.01.23 00:00	03.03.23 23:59
Старшее поколение	Управление социальной политики	Отвественный	Согласовано	22.03.2023 12:12	Согласовано	01.01.23 00:00	28.03.23 23:59
Старшее поколение	Управление здравоохранения	Отвественный	Согласовано	16.02.2023 15:44	Согласовано	01.01.23 00:00	28.03.23 23:59
Укрепление общественного здоровья	Управление здравоохранения	Отвественный	Не согласовано	20.03.2023 17:31	Не согласовано	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Содействие занятости	Управление социальной политики	Отвественный	Не согласовано		Не согласовано	01.01.23 00:00	15.03.23 23:59
Спорт-норма жизни	Елецкий район	Системный	Заполнено	24.03.2023 16:54	Заполнено	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Спорт-норма жизни	Дубровский район	Системный	Заполнено	02.03.2023 08:38	Заполнено	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Спорт-норма жизни	Красноярский район	Системный	Заполнено	02.03.2023 15:08	Заполнено	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Спорт-норма жизни	Лебедянский район	Системный	Не согласовано		Не согласовано	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Спорт-норма жизни	г. Липецк	Системный	Заполнено	01.02.2023 12:34	Заполнено	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Спорт-норма жизни	ОКУ «ИКС Липецкой области»	Системный	Не согласовано	23.03.2023 15:00	Не согласовано	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Здравоохранение	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	Управление здравоохранения	Не согласовано	15.03.2023 12:05	Не согласовано	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Борьба с инфекционными заболеваниями	Управление здравоохранения	Отвественный	Не согласовано		Не согласовано	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59
Обеспечение медицинскими препаратами	Управление здравоохранения	Отвественный	Согласовано	20.03.2023 17:15	Согласовано	01.01.23 00:00	24.03.23 23:59

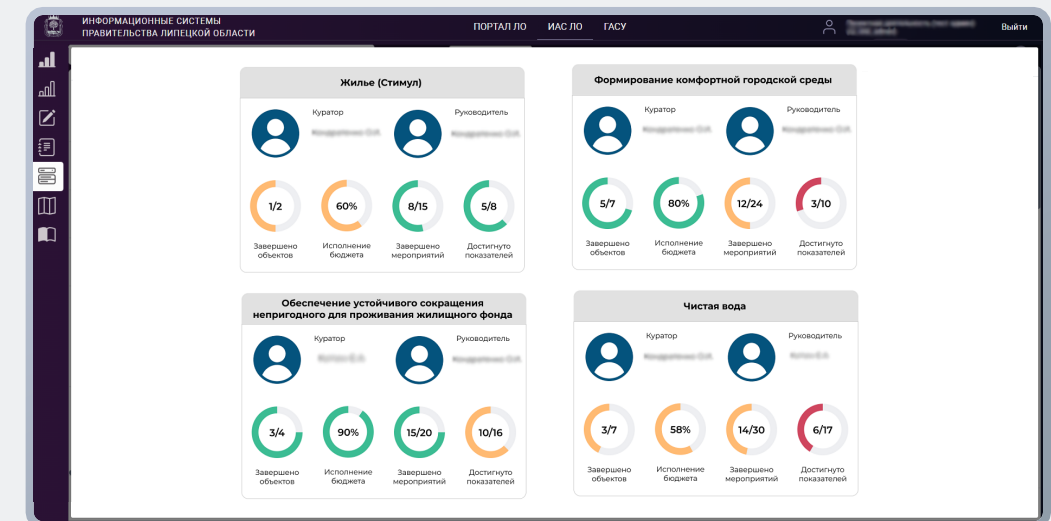

Преимущества системы



Удобный и доступный
пользовательский интерфейс



Более детализированное ведение задач, чем в Электронном бюджете, работа с конкретными мероприятиями и объектами



Интеграция с данными системы «Электронный бюджет» и бюджетной росписью



Инструменты управления изменениями с возможностью настройки различных маршрутов согласования



Интерактивные дашборды о ходе реализации проектов для всех заинтересованных лиц





Настраиваемая ролевая модель разграничения доступа к информации на всех уровнях



Гибкие настройки системы и модели данных,
адаптируемость к требуемым изменениям



Различные варианты визуализации данных (диаграммы, графики, карта)

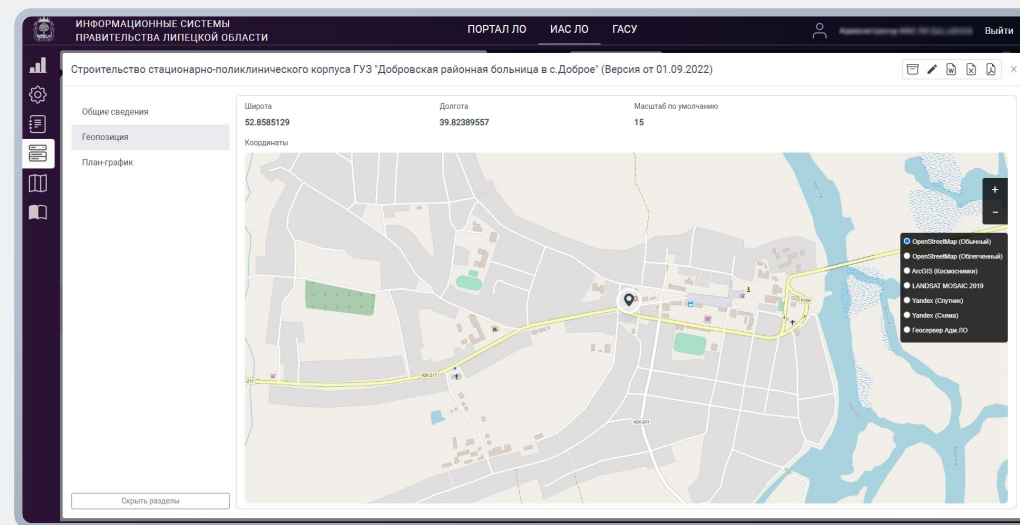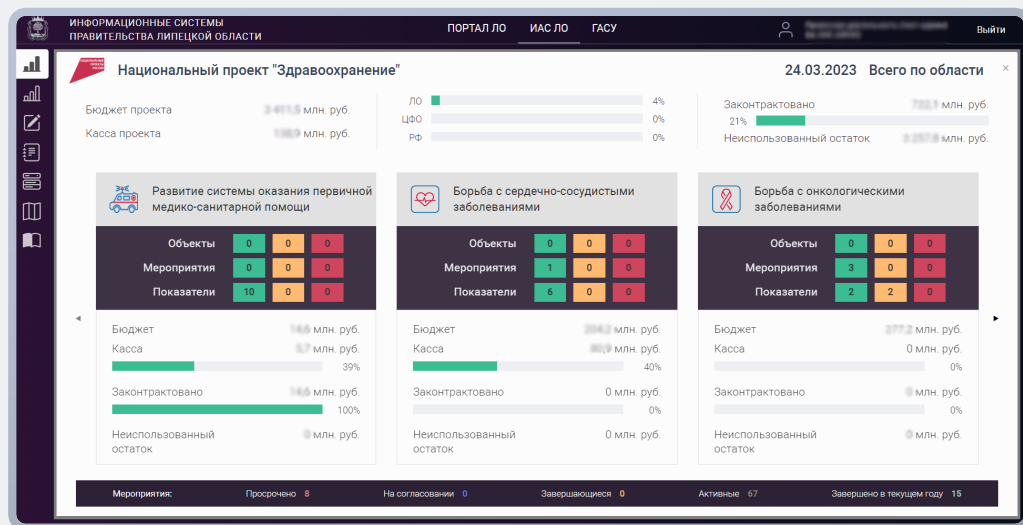

Эффекты от внедрения



Повышение эффективности
межведомственного взаимодействия
участников проектной деятельности



Обеспечение доступа всех заинтересованных
лиц к единой версии информации о ходе
реализации проектов



Повышение оперативности предоставления информации



Повышение прозрачности информации
по финансированию проектов за счет детализации
до уровня отдельных объектов и контрактов



Повышение оперативности реагирования
при срыве промежуточных и конечных
сроков реализации объектов



Повышение качества информации

Около **70%**

Общее снижение
трудозатрат
на ведение проектов

До **80%**

Повышение
скорости анализа

Около **50%**

Сокращение времени
на поиск ранее
разрозненной информации

- 01 О нас
- 02 Система управления программами и проектами
- 03 **Примеры аналитики и отчетности**
- 04 Технические особенности системы
- 05 Контакты

Интеграционные потоки



Национальные проекты и государственные программы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОРТАЛ ЛО ИАС ЛО ГАСУ

Иванов Иван Иванович Выйти

Национальные проекты Липецкой области

07.10.2024 Всего по области

ПРОЕКТЫ	Бюджет (ФБ+ОБ), млн.руб.	Касса(ФБ+ОБ), млн.руб.	Контрактация, процент	Кассовое освоение, процент	Объекты и мероприятия	Контрольные события	Показатели
Демография	1 252,2	918,8	0,0%	73,38% +6,6%	17	5 / 102	2 / 19
Здравоохранение	4 259,9	1 397,3	76,1%	32,80% +0,1%	34	73 / 264	12 / 54
Образование	4 349,2	3 173,8	0,0%	72,97% +0,9%			
Жилье и городская среда	2 579,4	1 412,3	47,4%	54,75% +1,4%			
Экология	253,1	74,4	-	29,38%			
БКД	10 004	6 635,4	97,5%	66,33% +1,7%			
Производительность труда	27,8	27,8	-	100,00%			
Цифровая экономика	0	0	-	0,00%			
Культура	606,1	401,8	74,6%	66,29% +1,0%			
МСП	272,4	220,9	0,0%	81,10%			
Кооперация и экспорт	5,8	0	-	0,00%			
Туризм и индустрия гостеприимства	263,7	232,1	-	88,01%			
Беспилотные авиационные системы	18	9	-	50,00%			
Итого по всем проектам	23 891,6	14 503,4	63,9%	60,71% +1,40%			

Государственные программы







07.10.2024 Всего по области

	Бюджет (ФБ+ОБ), млн.руб.	Касса(ФБ+ОБ), млн.руб.	Контрактация, процент	Кассовое освоение, процент	Объекты и мероприятия	Контрольные события
Развитие здравоохранения	390,6	166,8	-	42,70% +42,7%	19	19 / 71
Обеспечение жителей качественным жильем	1 903,5	541,1	-	28,43% +28,4%	2	3 / 20
Социальная поддержка граждан	382,7	101,2	-	26,44% +26,4%	11	9 / 115
Эффективное государственное управление	63	0	-	0,00%	2	4 / 20
Обеспечение населения качественными коммунальными услугами	3 318,2	1 498	1,0%	45,14% +45,1%	117	236 / 666
Комплексное развитие сельских территорий	1 943,9	1 366,3	57,7%	70,29% +70,3%	43	163 / 456
Развитие физической культуры и спорта	352,5	176,2	0,0%	50,00% +50,0%	3	10 / 103
Инвестиционная привлекательность и развитие промышленности	1 679,9	1 137,5	0,0%	67,71% +67,7%	11	3 / 28
Развитие сельского хозяйства	2 910,1	2 060,5	0,0%	70,81% +70,8%	36	0 / 0
Развитие образования	2 907,8	1 296	20,4%	44,57% +44,6%	27	22 / 106
Развитие транспортной системы	1 996,5	652,5	0,0%	32,68% +32,7%	37	39 / 174
Охрана окружающей среды	115	35,5	43,2%	30,83% +30,8%	21	15 / 151
Управление государственными финансами	108,8	13,4	-	12,31% +12,3%	1	0 / 0
Итого по всем проектам	18 072,5	9 044,9	16,2%	50,05% +50,05%	330	523 / 1910

Кассовое исполнение расходов бюджетов субъектов РФ

Национальные проекты Липецкой области

При нажатии на это поле dashboard автоматически показывает Бюджет: ФБ+ОБ, только ФБ, только ОБ

ПРОЕКТЫ	Бюджет (ФБ+ОБ), млн.руб.	Касса (ФБ+ОБ), млн.руб.	Кассовое освоение, процент	Ключевые не заcontractованные объекты
 Демография	1 731,8	812,1	46,9%  +1,0%	1 ЦЗН (Усмань)
 Здравоохранение	3 473,4	1 481,1	42,6%  +29,1%	
 Образование	1 415,2	461,4	32,6%  +0,1%	Школа г. Лебедянь*
 ЖКХ и городская среда	3 793,3	556,3	14,7%  +0,1%	
 Экология	1 071,9	829,2	77,4%  +1,6%	
 БКД	9 556,2	3 205,8	33,5%  +0,4%	
 Производительность труда	20,5	20,5	100,0% 	
 Цифровая экономика	0	0	0,0% 	
 Культура	523,1	369	70,5%  +1,6%	
 МСП	391,6	326,5	83,4%  +7,6%	
 Кооперация и экспорт	13,9	8,9	64,1% 	
 Туризм и индустрия гостеприимства	223,4	0	0,0% 	
Итого по всем проектам	22 214,4	8 070,8	36,0%  +5,0%	








Имеется возможность просматривать dashboard по нацпроектам, а также прогресс по кассе за неделю и детализацию по национальным и региональным проектам

Дашборды по ИОГВ и МО

Национальные проекты Липецкой области

14.10.2024

	ПРОЕКТЫ	Бюджет (ФБ+ОБ), млн.руб.	Касса(ФБ+ОБ), млн.руб.	Кассовое освоение, процент	
	Демография	0	0	0,00%	
	Образование	1 225	774	63,18%	+0,1%
	Жилье и городская среда	1 299,8	658,1	50,63%	+0,6%
	Экология	0	0	0,00%	
	БКД	2 922,5	2 483,6	84,98%	+26,9%
	Культура	7,2	3,5	48,87%	
Итого по всем проектам		5 454,5	3 919,2	71,85%	+14,60%

г. Липецк




- Измалковский район
- Краснинский район
- Лебедянский район
- Лев-Толстовский район
- Липецкий район
- Становлянский район
- Тербунский район
- Усманский район
- Хлевенский район
- Чаплыгинский район
- ▶ г. Липецк
- г. Елец
- Управление государственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой

92

97 / 462


Рейтинги ИОГВ по освоению бюджета

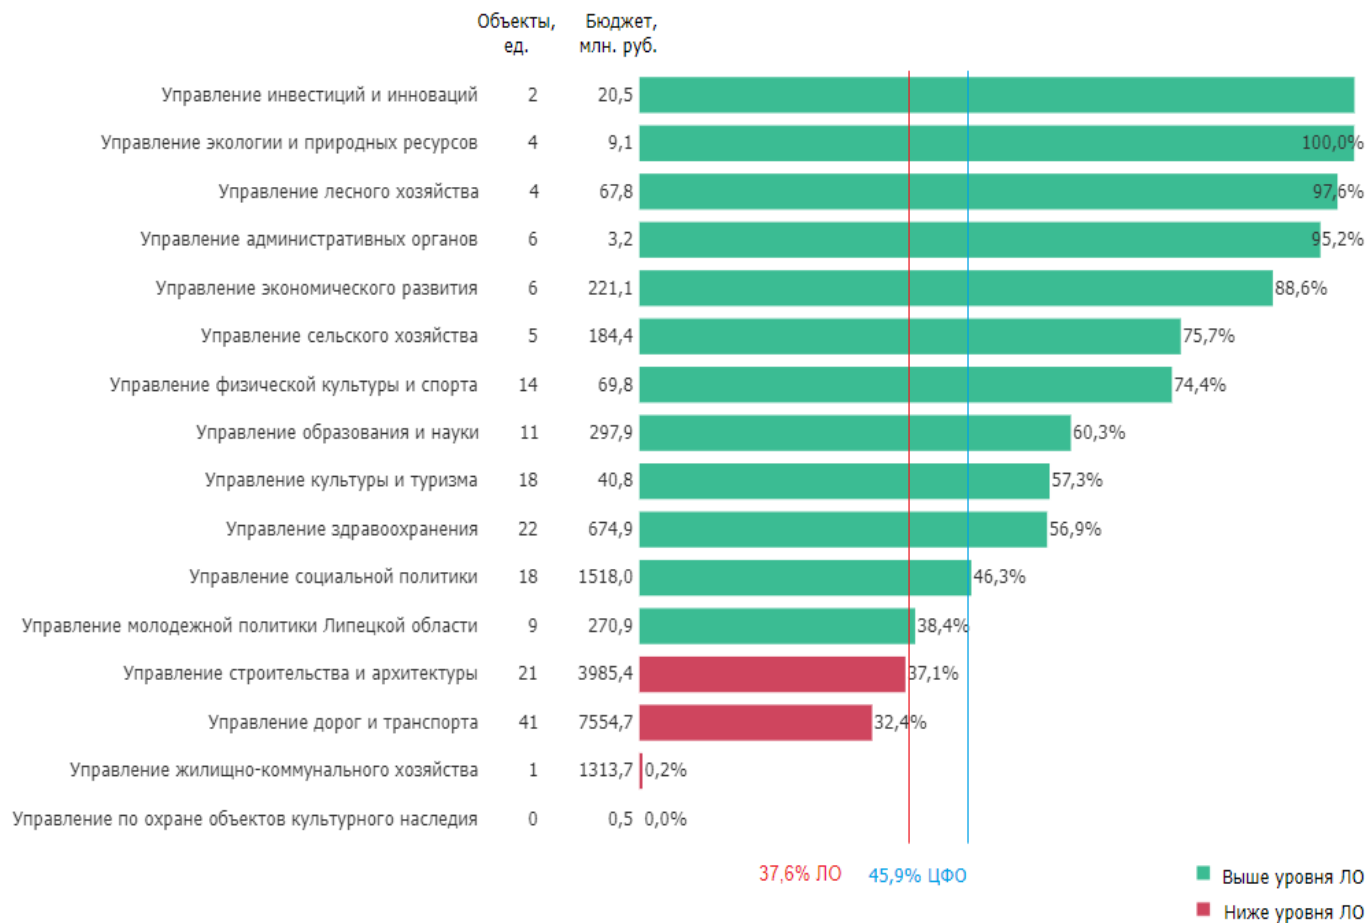

Ежедневно, через систему «Форсайт» загружаем данные из бюджетной росписи в систему ИАС ЛО

На основании данных из бюджетной росписи автоматически формируется рейтинг ИОГВ по освоению бюджета НП

План-факт по кассовому освоению

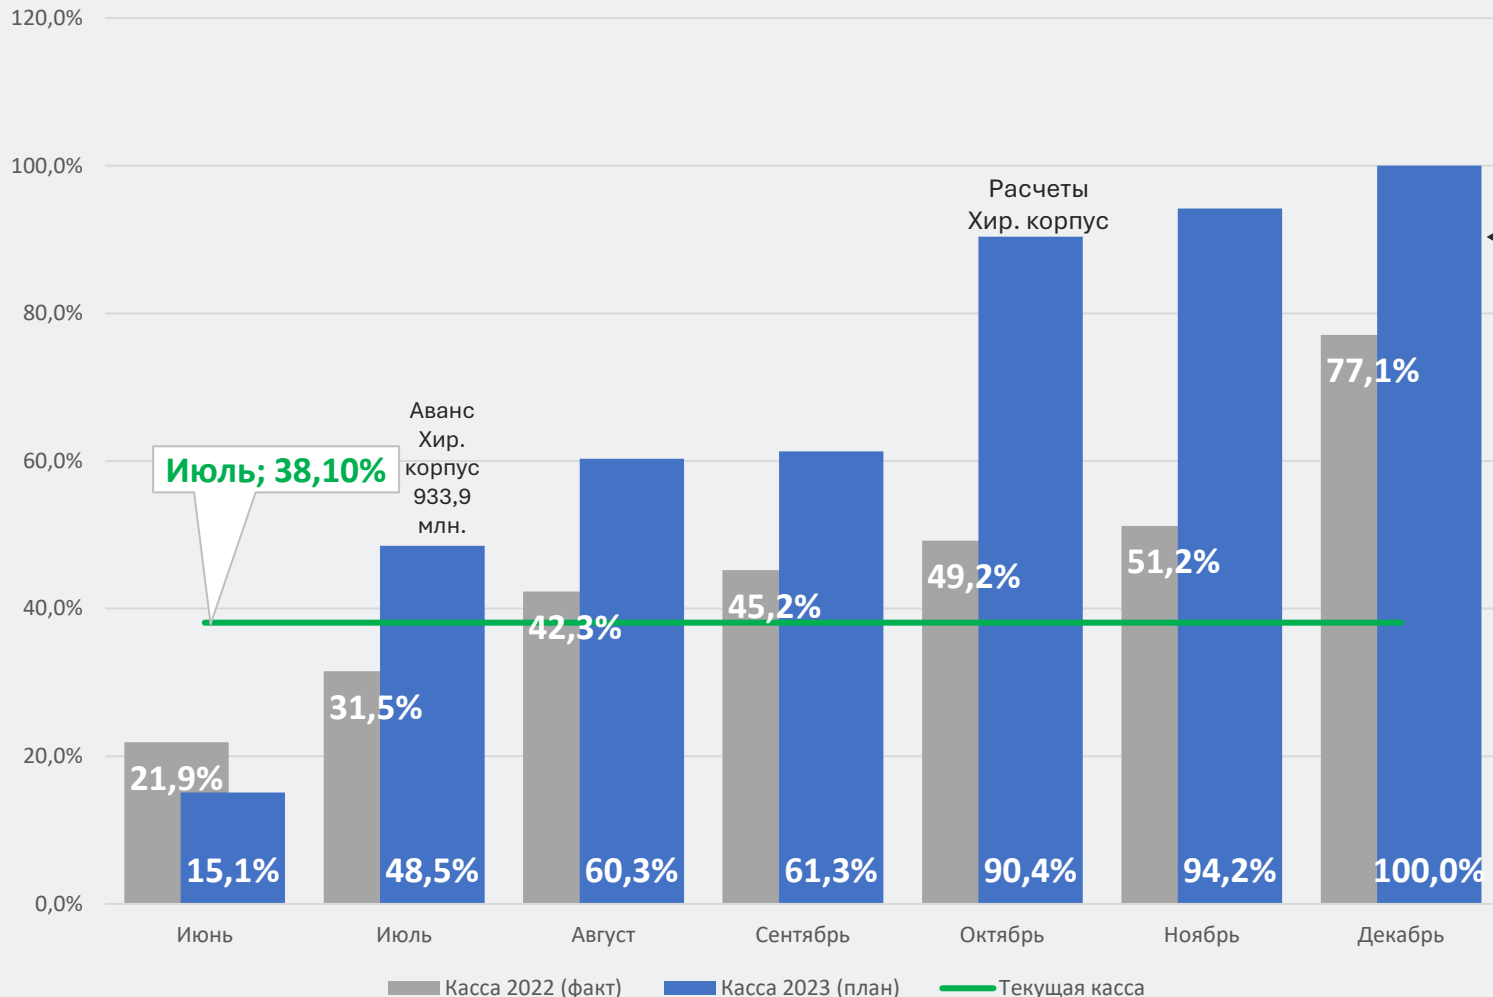

Отдельно, самостоятельно строим графики по плану/факту кассового исполнения по ИОГВ. Анализируем темпы кассового освоения, укладываются ли исполнители в утвержденный график, а также сравниваем с темпами кассового освоения в предыдущем году.

Бюджет 2022 года – 1 892 млн. руб.

Бюджет 2023 года – 3 625,7 млн. руб.

Информация об объемах бюджетных средств (ФБ и РБ), направленных на реализацию национальных проектов в 2024 году
(оперативные данные по состоянию на 07.10.2024г.)

2	НП "Образование"		6 050,00	4 500,00
1	Современная школа (Липецкая область)	Е1	1 500,00	1 000,00
2	Успех каждого ребенка (Липецкая область)	Е2	1 300,00	900,00
4	Цифровая образовательная среда (Липецкая область)	Е4	1 100,00	800,00
6	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	ЕВ	900,00	700,00
7	Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Липецкая область)	ЕГ	700,00	600,00
8	Социальная активность (Липецкая область)	Е8	550,00	500,00

32

Кассовое исполнение расходов бюджетов субъектов РФ

Кассовое исполнение нацпроектов
по данным Минфина России
на 11.07.2023

Еженедельно получаем от Министерства
финансов РФ данные по кассовому освоению




Мониторинг финансового обеспечения реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов в 2023 году													
11.07.2023													млн. рублей
Наименование субъекта Российской Федерации	Всего на реализацию региональных проектов						Контрактные обязательства, заказчиками по которым выступают государственные и муниципальные органы, казенные учреждения						
	Бюджеты субъектов Российской Федерации			Бюджеты муниципальных образований									
	Предусмотрено на 01.06.2023	Исполнено		Предусмотрено на 01.06.2023	Исполнено		Предусмотрено	Исполнено		Справочно: по данным ЕИС в сфере закупок			
		Объем	% от плана		Объем	% от плана		Объем	% от плана	Сумма зарегистрированных контрактов, подлежащих исполнению в 2023 г.	% от плана		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Российская Федерация	2 043 110,0	837 363,6	41,0	700 733,5	229 818,2	32,8	1 353 040,4	500 865,9	37,0	1 043 826,3	77,1		
Центральный федеральный округ	545 085,5	241 281,1	44,3	175 099,6	53 458,1	30,5	308 387,4	110 307,7	35,8	238 945,9	77,5		
Белгородская область	10 408,9	5 515,9	53,0	3 594,6	1 913,7	53,2	7 818,6	4 191,3	53,6	5 456,5	69,8		
Брянская область	13 110,3	3 794,4	28,9	6 706,4	1 696,8	25,3	10 705,9	2 321,9	21,7	8 517,7	79,6		
Владимирская область	13 834,6	5 690,7	41,1	8 294,2	3 742,6	45,1	7 743,5	2 992,7	38,6	6 070,0	78,4		
Воронежская область	31 920,6	11 345,7	35,5	14 909,5	3 552,0	23,8	27 605,2	7 647,4	27,7	21 254,8	77,0		
г. Москва	124 878,7	78 570,0	62,9	0,0	0,0	-	19 439,0	5 110,1	26,3	16 466,6	84,7		
Ивановская область	11 859,0	4 872,6	41,1	5 213,6	1 919,6	36,8	8 561,8	3 497,2	40,8	7 979,4	93,2		
Калужская область	16 793,9	6 518,0	38,8	8 573,9	3 229,1	37,7	8 877,9	3 641,3	41,0	7 460,3	84,0		
Костромская область	12 953,9	6 270,2	48,4	4 899,0	1 768,5	36,1	4 081,0	1 392,2	34,1	3 284,4	80,5		
Курская область	17 319,6	6 745,1	38,9	4 951,0	2 763,0	55,8	11 139,8	4 318,3	38,8	9 115,4	81,8		
Липецкая область	20 171,0	6 972,3	34,6	8 092,8	3 222,8	39,8	17 518,4	6 563,7	37,5	11 161,2	63,7		
Московская область	140 272,1	57 025,8	40,7	77 486,7	18 573,3	24,0	97 698,5	40 819,0	41,8	80 747,6	82,6		
Орловская область	9 413,8	4 007,8	42,6	4 148,7	1 870,2	45,1	6 603,6	2 726,3	41,3	5 339,6	80,9		
Рязанская область	22 172,9	7 819,7	35,3	6 605,0	1 764,0	26,7	16 367,7	4 734,1	28,9	10 790,3	65,9		
Смоленская область	18 118,4	7 975,2	44,0	3 786,3	1 509,4	39,9	7 031,1	2 412,8	34,3	4 083,8	58,1		
Тамбовская область	11 547,4	6 810,2	59,0	2 631,6	1 335,4	50,7	5 399,1	3 435,0	63,6	4 937,6	91,5		
Тульская область	28 839,9	8 288,8	28,7	2 470,7	1 155,6	46,8	25 170,8	6 631,7	26,3	16 563,9	65,8		
Тверская область	16 383,5	5 390,8	32,9	6 331,7	2 102,1	33,2	8 320,5	2 039,1	24,5	6 625,6	79,6		
Ярославская область	25 086,9	7 667,7	30,6	6 403,9	1 340,0	20,9	18 305,1	5 833,4	31,9	13 091,4	71,5		

Данные подгружаются
в ИАС ЛО и
автоматически
формируются
отчеты



Аналитика бюджета и кассового исполнения ЛО

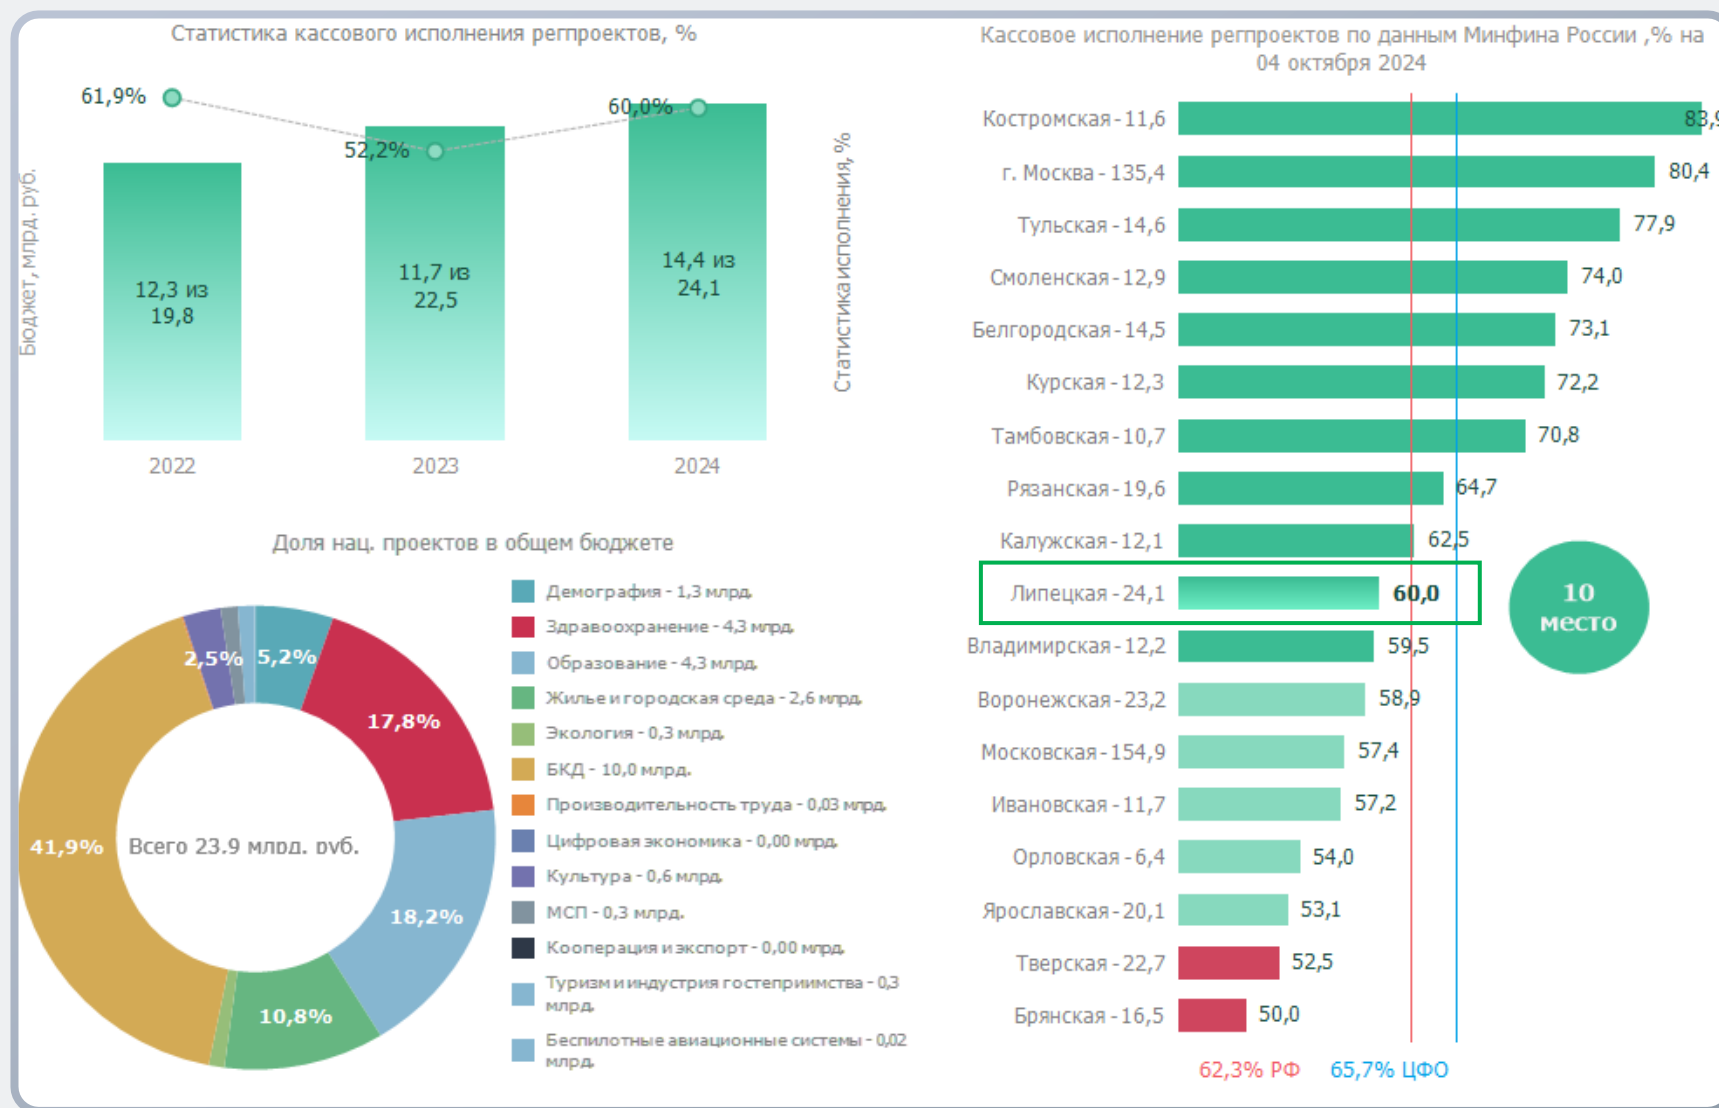

Кассовое исполнение расходов бюджетов субъектов РФ на реализацию нацпроектов на, %

Еженедельно получаем от Министерства финансов РФ данные по кассовому освоению в разрезе по национальному проекту и региону


Сведения о кассовом исполнении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию национальных проектов, %													
11.07.2023													
Субъект Российской Федерации	Демография	Здравоохранение	Образование	Жилье и городская среда	Экология	Безопасные качественные дороги	Производительность труда	Цифровая экономика	Культура	Малое и среднее предпринимательство	Международная кооперация и экспорт	Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	Туризм и индустрия гостеприимства
Российская Федерация	46,3	41,7	44,5	33,3	44,2	38,6	83,2	36,4	46,1	64,4	54,3	91,2	11,6
Центральный федеральный округ	52,6	45,7	48,9	29,7	41,2	44,8	85,1	34,3	40,1	68,6	67,4	16,7	2,6
Белгородская область	42,9	51,1	34,6	34,1	1,5	97,2	100,0	-	44,7	61,6	0,0	-	30,9
Брянская область	36,0	25,8	23,4	36,4	41,8	24,6	100,0	26,9	19,0	55,8	0,0	-	-
Владимирская область	40,3	27,0	48,7	44,7	86,8	44,8	-	-	54,3	77,3	-	-	0,0
Воронежская область	35,2	33,8	27,6	20,9	50,0	53,1	100,0	-	42,8	83,5	86,8	-	2,1

Данные подгружаются в ИАС ЛО и автоматически формируется отчет. Добавлена информация о доле от общего бюджета ЛО по каждому НП и инфо о недельном приросте

Субъект Российской Федерации	Демография	Здравоохранение	Образование	ЖКХ и городская среда	Экология	БКД	Производительность труда	Цифровая экономика	Культура	МСП	Кооперация и экспорт	Туризм
Доля общего бюджета РП ЛО	7,8%	15,6%	6,4%	17,1%	4,8%	43,0%	0,1%	0,0%	2,4%	1,8%	0,1%	1,0%
Липецкая область	47,0+2,8%	42,7+28,8%	32,6+0,1%	14,7	77,4+1,3%	33,6	100,0	-	70,5+1,5%	83,4+7,6%	64,1	0,0
РФ	47,9+1,5%	44,4+2,7%	46,0+1,5%	32,5	47,0+2,8%	39,7+1,0%	84,1+0,8%	37,1+0,7%	46,7+0,6%	66,5+2,1%	55,3+1,0%	14,2+2,5%
ЦФО	53,6+1,0%	49,1+3,4%	50,1+1,2%	30,1+0,4%	46,1+4,9%	47,2+2,5%	85,1	33,8	41,5+1,5%	70,4+1,8%	65,9	4,2+1,7%
Белгородская область	43,8+0,9%	52,6+1,5%	34,8+0,2%	34,2+0,1%	1,5	97,7+0,5%	100,0	-	50,8+6,0%	61,6	0,0	62,8+31,9%

Декомпозиция до объекта

Географическое расположение:

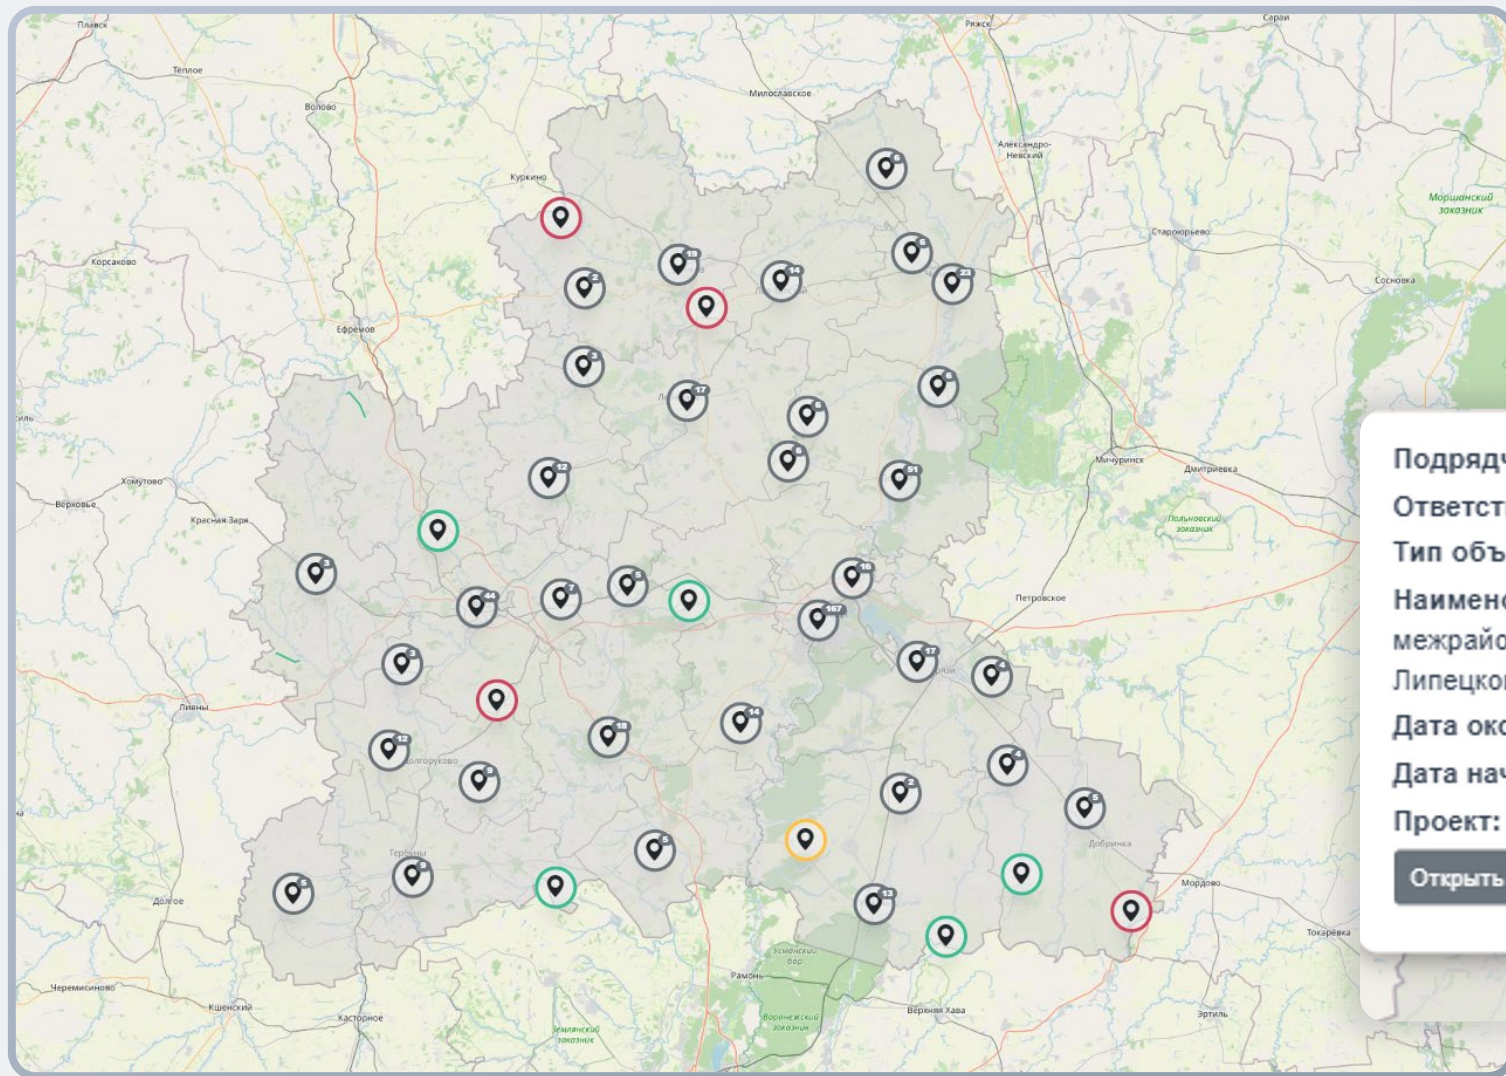

Карта объектов

с возможностью перехода
в карточку объекта или
быстрого визуального контроля
СМР с камер видеонаблюдения

Подрядчик: Подрядчик не определен

Ответственный за объект: [Имя]

Тип объекта: Ремонт

Наименование: Текущий ремонт Становлянского отдела
межрайонного филиала №2 ОКУ "Центр занятости населения
Липецкой области"

Дата окончания реализации: 29.12.2023

Дата начала реализации: 09.01.2023

Проект: Содействие занятости

Открыть карточку

Перейти к камерам

Карточка объекта

Карточка объекта – форма с полями и вкладками, которые содержат информацию об объекте
Используется для хранения и просмотра данных, добавления новых или изменения имеющихся сведений

Строительство школы на 1224 места в [название]

(Версия элемента 01.04.2024)

Общие сведения

Геопозиция

План-график

Камеры видеонаблюдения

Контракты

Информация о финансировании

Готовность объекта

Риски

Техническая готовность

Наименование

Строительство школы на 1224 места в [название]

Проект

Современная школа

Результат

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Тип объекта

Капитальное строительство

Ответственный за объект

Руководитель работ по объекту

Дата начала реализации

09.01.2023

Муниципальное образование

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «СОЛИДАРНОСТЬ»

Мощность объекта

1224

Уровень значимости

Ключевой

Куратор объекта

Администратор объекта

Дата окончания реализации

31.12.2024

Адрес

Наименование заказчика

УКС Липецкой области

Единица мощности объекта

места

Строительство школы на 1224 места в [название]

(Версия элемента 01.04.2024)

Общие сведения

Геопозиция

План-график

Камеры видеонаблюдения

Контракты

Информация о финансировании

Готовность объекта

Риски

Техническая готовность

Широта

Долгота

Масштаб по умолчанию

16

Координаты


Камеры видеонаблюдения

Наименование	Ссылка на камеру
камера 1	https://camera.lipetsk.ru/index.php?r=camera%2Fvideo&id=22172
камера 2	https://camera.lipetsk.ru/index.php?r=camera%2Fvideo&id=22173
камера 3	https://camera.lipetsk.ru/index.php?r=camera%2Fvideo&id=22174
камера 4	https://camera.lipetsk.ru/index.php?r=camera%2Fvideo&id=22175

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВКЛЮЧАТЬ В КОНТРАКТЫ

План-график выполнения работ

План-график выполнения работ по и его визуализация в виде таблицы, диаграммы Ганта и временной шкалы для мониторинга исполнения

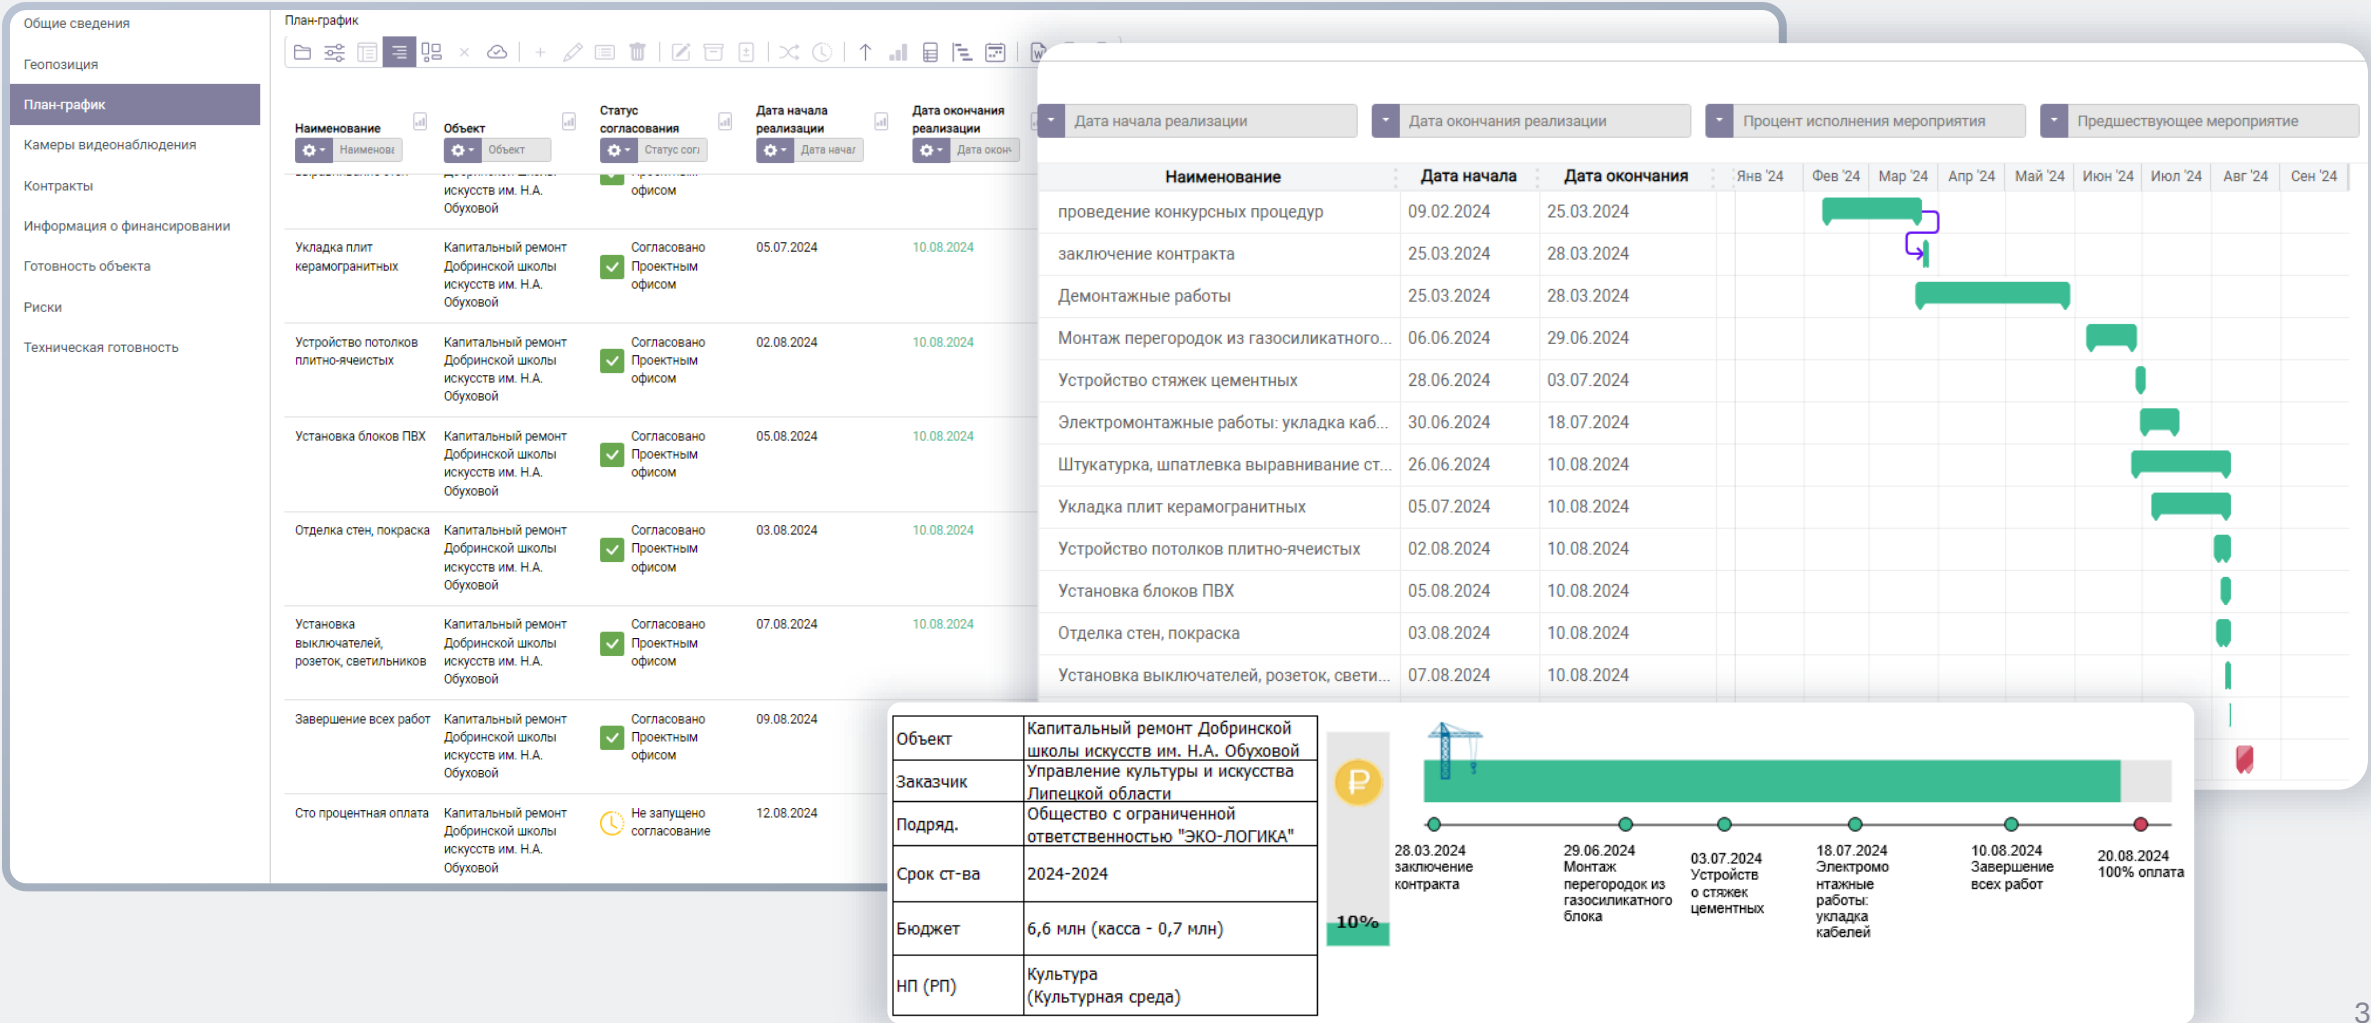

Сравнение версий план-графиков по объектам

Отчет: Сравнение с прошлой версией... Объекты: Объекты с версиями (Выделено 2 из 1593) Статус объекта: Статусы объекта (Все элементы)

Строительство ледового дворца в с.Хрущевка Липецкого муницип...

Версия 1 от 16.04.2021 (согласовано)

Версия 2 от 16.02.2022 (в процессе)

Версия 3 от 24.02.2022 (согласовано)

Версия 4 от 08.04.2022 (согласовано)

Версия 5 от 18.05.2022 (согласовано)

Версия 6 от 23.05.2022 (согласовано)

Версия 7 от 29.06.2022 (в процессе)

Версия 8 от 12.07.2022 (согласовано)

Версия 9 от 29.03.2023 (согласовано)

Плана-графика с прошлой версией

Объект / мероприятие	Инициатор	Дата начала	Дата окончания	Наименование (прошлой версии)	Ответственный (прошлой версии)	Дата начала реализации (прошлой версии)	Дата окончания реализации (прошлой версии)
Заключение контрактов на оборудование							
Оплата за СМР			06.2023	Оплата за СМР	Алпатов Сергей Владимирович	01.07.2023	01.10.2023
Поставка и расстановка мебели	Алпатов Сергей Владимирович	26.07.2023	30.08.2023				
Техинвентаризация	Алпатов Сергей Владимирович	04.09.2023	30.09.2023	Техинвентаризация	Алпатов Сергей Владимирович	04.09.2023	30.09.2023
Передача объекта в управление физкультуры и спорта	Алпатов Сергей Владимирович	25.09.2023	30.09.2023				
"Проведение мероприятий по получению заключения органа государственного строительного надзора объекта"	Алпатов Сергей Владимирович	02.10.2023	30.10.2023	"Проведение мероприятий по получению заключения органа государственного строительного надзора объекта"	Алпатов Сергей Владимирович	02.10.2023	30.10.2023
"Получение разрешения на ввод и эксплуатацию объекта капитального строительства"	Алпатов Сергей Владимирович	30.10.2023	20.11.2023	"Получение разрешения на ввод и эксплуатацию объекта капитального строительства"	Алпатов Сергей Владимирович	30.10.2023	20.11.2023
Строительство ледового дворца в с.Хрущевка Липецкого муниципального района (с 29.03.2023)	Алпатов Сергей Владимирович	15.01.2022	30.11.2023	Строительство ледового дворца в с.Хрущевка Липецкого муниципального района (с 12.07.2022)	Алпатов Сергей Владимирович	15.01.2022	01.04.2023
Присоединение к водоснабжению	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	10.03.2023	Присоединение к водоснабжению	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	10.03.2023
Присоединение к водоотведению	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	30.03.2023	Присоединение к водоотведению	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	30.03.2023
Присоединение к электросети	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	29.05.2023	Присоединение к электросети	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	10.03.2023
Присоединение к теплоснабжению	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	29.05.2023	Присоединение к теплоснабжению	Алпатов Сергей Владимирович	10.02.2022	10.03.2023
Монтаж сэндвич-панелей 40%	Алпатов Сергей Владимирович	16.12.2022	05.01.2023	Монтаж сэндвич-панелей 40%	Алпатов Сергей Владимирович	16.12.2022	05.01.2023
Потолки 20%	Алпатов Сергей Владимирович	20.12.2022	12.06.2023	Потолки 20%	Алпатов Сергей Владимирович	20.12.2022	20.01.2023
Полы 40%	Алпатов Сергей Владимирович	21.12.2022	05.01.2023	Полы 40%	Алпатов Сергей Владимирович	21.12.2022	05.01.2023
Стены 40%	Алпатов Сергей Владимирович	21.12.2022	05.01.2023	Стены 40%	Алпатов Сергей Владимирович	21.12.2022	05.01.2023
Подписан акт ввода объекта в эксплуатацию	Алпатов Сергей Владимирович	22.12.2022	30.11.2023	Подписан акт ввода объекта в эксплуатацию	Алпатов Сергей Владимирович	22.12.2022	01.04.2023

В данном поле можно выбрать объект и версию с которой необходимо осуществить сравнение

Новый график

Прошлая версия

Конструктор отчетов

Быстрое формирование информации под нестандартные запросы

Мероприятия и объекты

Скрыть настройки

Сумма

Доступные поля

Тип объекта

Куратор объекта

Руководитель работ по объекту

Администратор объекта

Адрес

Единица мощности объекта

Мощность объекта

Результат

Не входит в общий мониторинг

Входит в мониторинг мощности

Уровень значимости

Отраслевое направление

Тип проекта

ГРЭС

Вышестоящая структура

Код подразделения областного бюджета

Код целевой статьи областного бюджета

Код КОСГУ областного бюджета

Код вида расхода областного бюджета

Код доп. классификации областного бюджета

Код ведомства областного бюджета

Код доп. классификации областного бюджета

Колонки

Строки

Наименование

Ответственный за объект

Дата окончания реализации

Дата начала реализации

Наименование заказчика

Подрядчик

Завершено

Статус работ по объекту

Финансирование объекта, план, тыс. руб.

Общее финансирование, тыс. руб.

Готовность объекта, %

Кассовое освоение, %

Проект

Госпрограмма

Нацпроект


Основные мероприятия ПАО "НЛМК"	Рощупкина Галина Павловна	31.12.2024	01.01.2021	ПАО "НЛМК"	Подрядчик не определен	Нет	Работы выполняются в рамках согласованного Плана-графика	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	Чистый воздух	нет данных	Экология
Основные мероприятия АО "Липецкцемент"	Рощупкина Галина Павловна	31.12.2024	01.01.2021	АО "Липецкцемент"	Подрядчик не определен	Нет	Все работы завершены	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	Чистый воздух	нет данных	Экология
"Сети водоснабжения и водоотведения Елецкого участка ОЗЗ ППТ "Липецк" и ОЗЗ РУ Елецпром. 2 этап" на территории городского округа г. Елец	Путилин Никита Сергеевич	29.03.2024	15.09.2019	ОГУП "Елецводоканал"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМКОМПЛЕКС"	Нет	Есть просроченные контрольные точки	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	ИРП Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области	Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды	нет данных
Очистные сооружения биочистки и пруды фильтрации ОЗЗ	Путилин Никита Сергеевич	31.12.2024	09.06.2020	ОГУП "Липецкводоканал"	Подрядчик не определен	Нет	Есть просроченные контрольные точки	180104.12	нет данных	нет данных	нет данных	ИРП Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области	Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды	нет данных

Быстрая аналитика

Параметр для построения графика

Наименование	Статус согласования	Дата начала реализации	Дата окончания реализации	Фактическая дата реализации	Планируемая дата реализации (если нарушен срок)	Ответственный	Проект
Наименование	Статус соглас.	Дата начала	27.07.2023	Фактическая	Планируемая	Ответственный	Проект

Переходим к аналитике

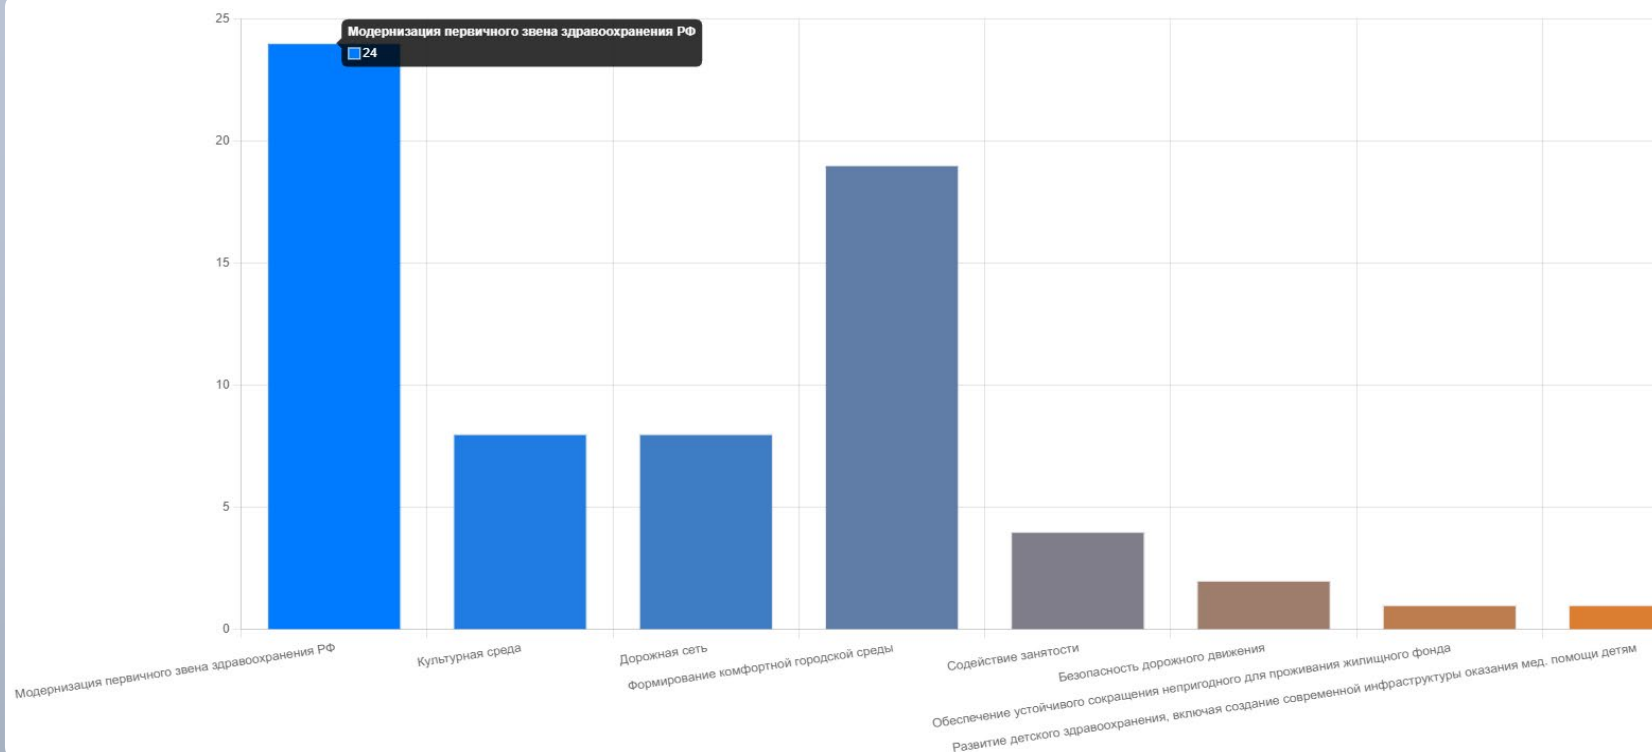

На построенном графике по горизонтальной оси мы можем увидеть наименования проектов, а по вертикальной – количество просроченным мероприятий. Система гибкая - можно строить аналитику не только по указанным показателям, но и по любым другим (исполненные КТ, исполненные в срок, планируемые к закрытию и т. д. Срезы также можно делать по муниципалитетам, или ответственным по ФИО)

- 01 О нас
- 02 Система управления программами и проектами
- 03 Примеры аналитики и отчетности
- 04 **Технические особенности системы**
- 05 Контакты

Архитектура системы

Система управления программами и проектами

Веб-портал



Vue.js

Управление реестрами и бизнес-процессами



Формирование отчетности и дашбордов



форсайт.
аналитическая платформа



Хранилище данных



PostgreSQL


Управление моделью данных

- Ведение структуры проектов в виде взаимосвязанных реестров
- Расширение модели данных за счет добавления различных типов атрибутов
- Управление связями реестров между собой
- Настраиваемые представления реестров
- Настройка представления карточки элемента реестра
- Настройка форматно-логического контроля
- Настройка оформления отображаемых данных

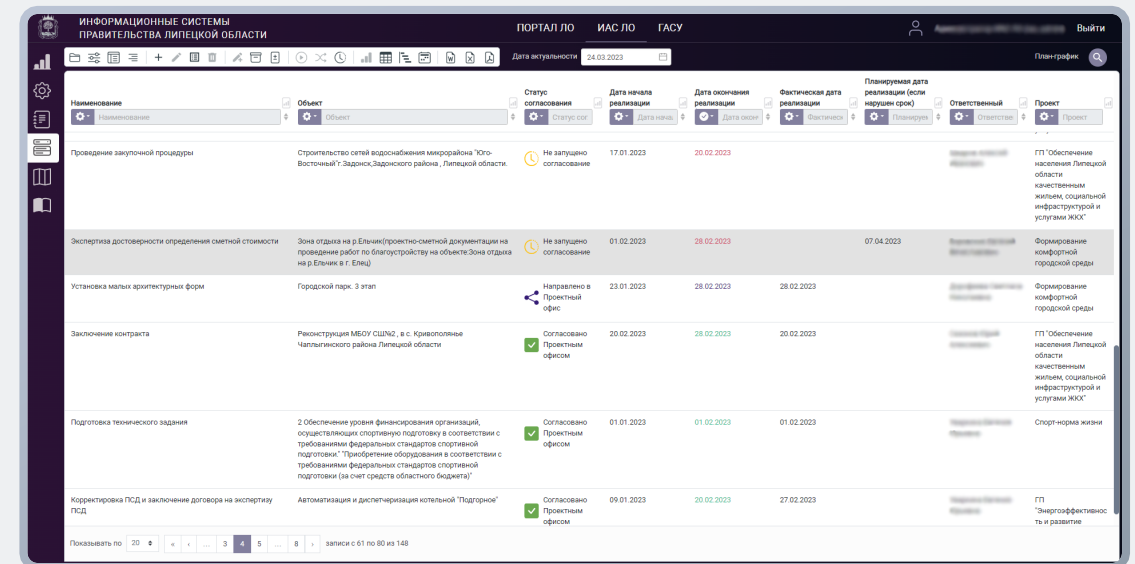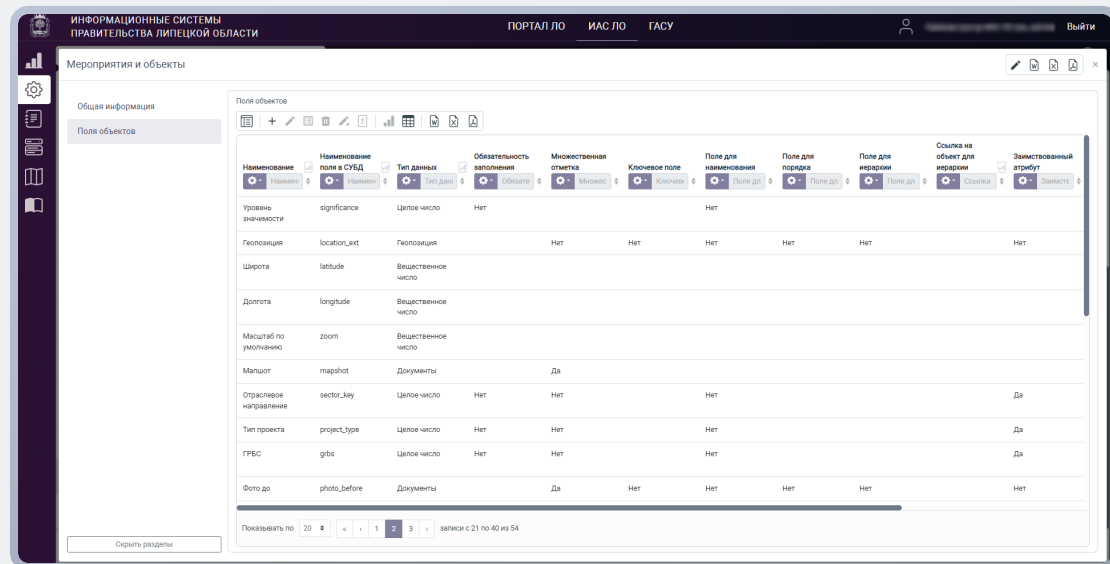


Управление изменениями

- Настройка версионности реестров
- Сравнение версий
- Ведение истории изменения элементов реестров
- Настройка статусов и маршрутов согласования

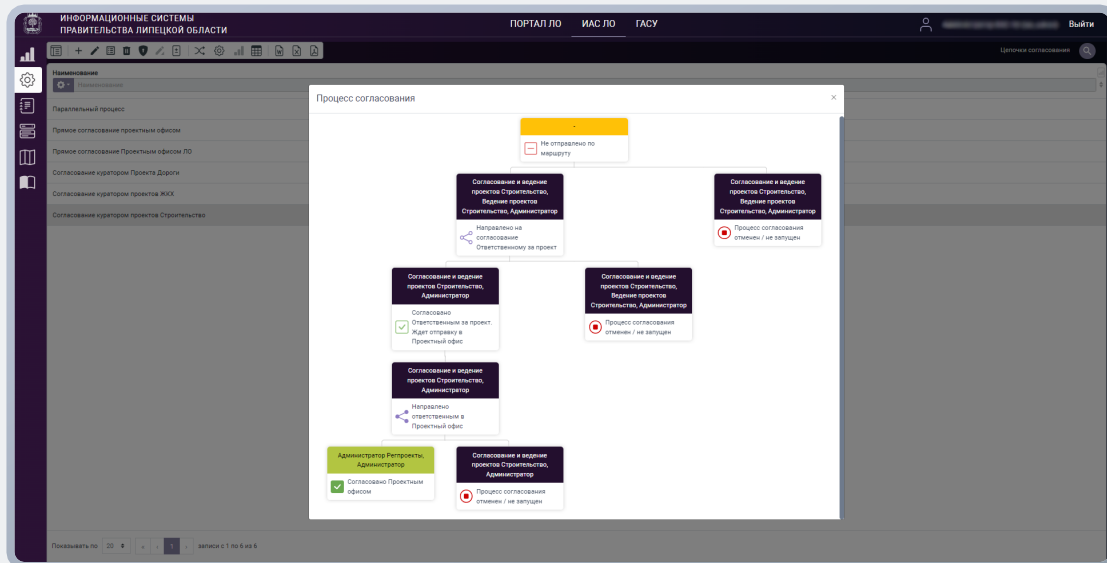


Управление доступом

- Ведение пользователей и их ролей в проекте с учетом ведомственной принадлежности
- Управление правами доступа к разделам и объектам системы
- Управление правами доступа к конкретным записям реестров
- Учет прав доступа в маршрутах согласования

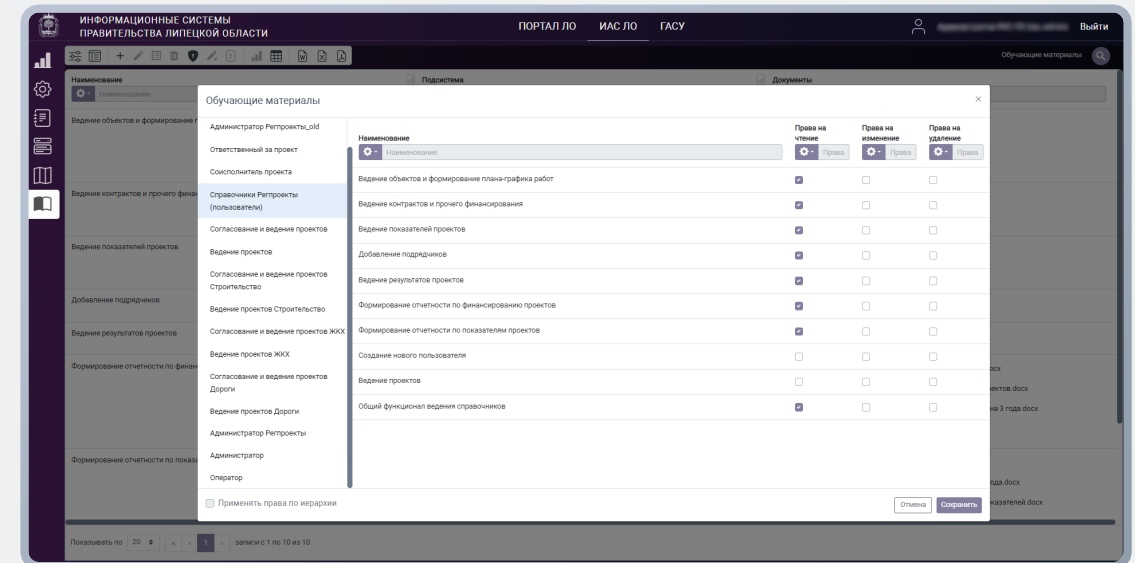


Полнотекстовый поиск

- Поиск по данным реестров
- Настройка представлений результатов поиска
- Настройка переходов к результатам поиска
- Полнотекстовый поиск по документам

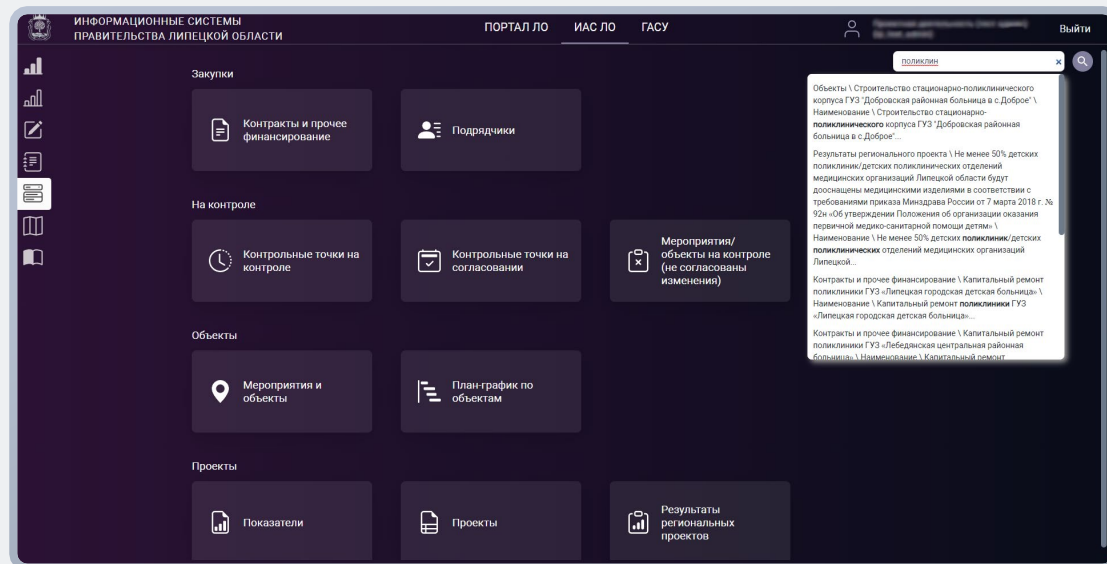


Хранение копий проектных документов

- Ведение проектных документов для каждой версии элемента
- Просмотр и скачивание документов в системе
- Индикация изменения версии документа

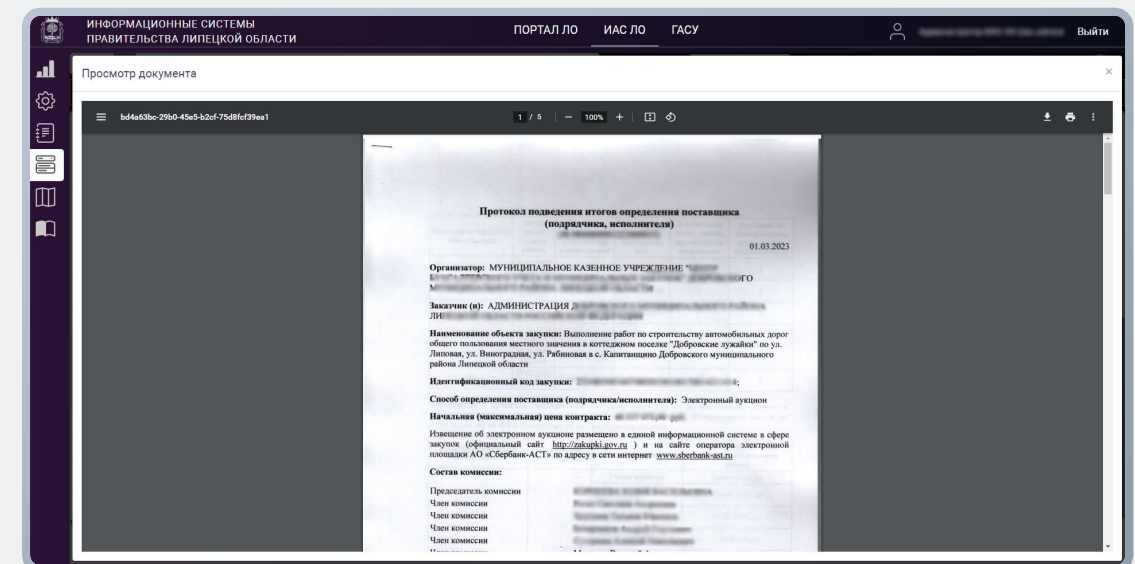


Картографическое представление

- Ведение геоинформации объектов (точки, линии, полигоны)
- Настройка отображения геоинформации (иконки, кластеризация, индикативное оформление в зависимости от данных)
- Подключение внешних географических подложек и слоев
- Настраиваемая фильтрация отображаемых элементов

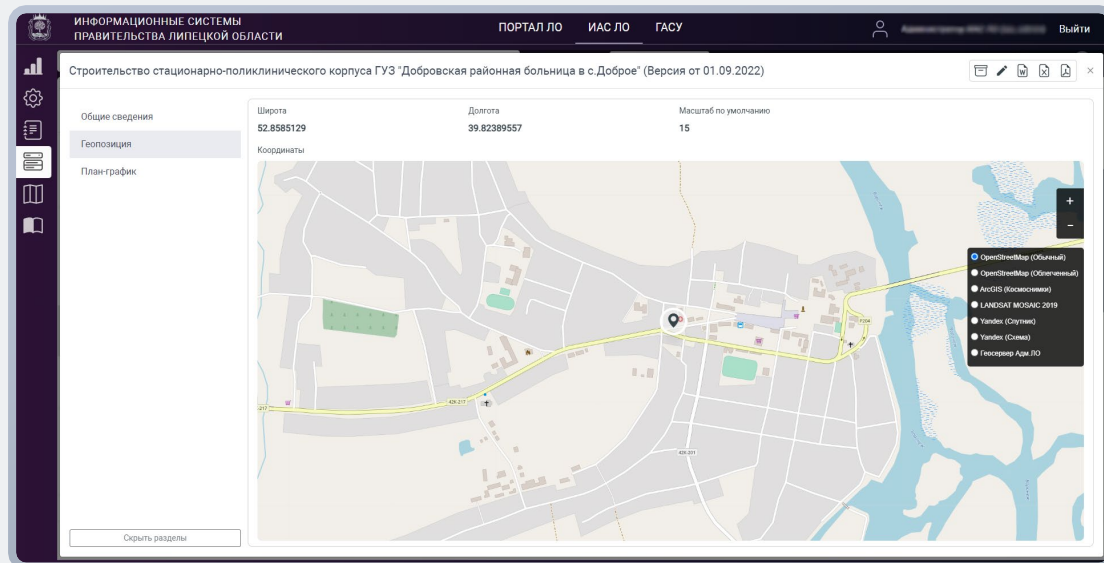


Календарь и диаграмма Ганта

- Представление данных в виде диаграммы Ганта и на календаре
- Настройка отображения диаграммы Ганта и календаря (зависимость мероприятий, прогресс, цветовая индикация)
- Экспорт представлений в форматы svg, png

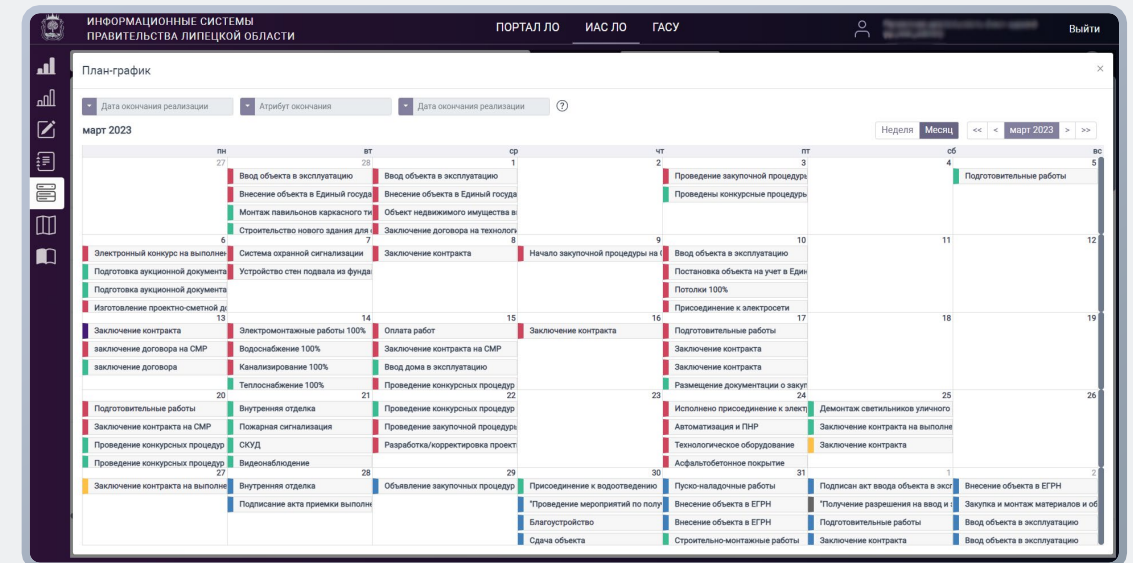


Работа с данными

- Сортировка и группировка элементов реестров по выбранным атрибутам
- Настройка пользовательских фильтров
- Формирование иерархической структуры элементов реестров
- Экспорт реестров и карточек элементов в форматы docx, xlsx, pdf

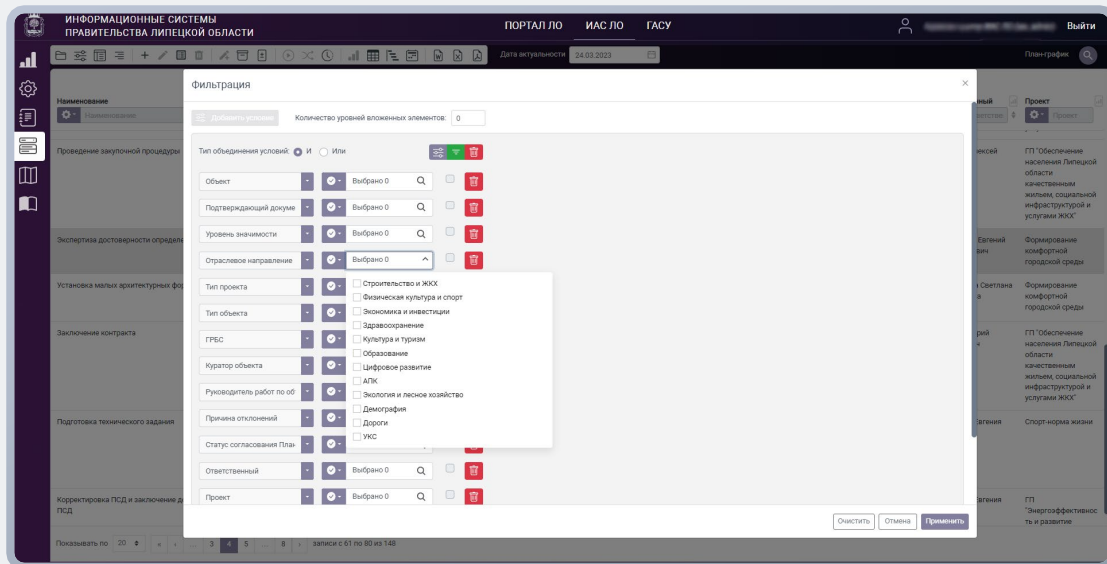

Анализ данных

- Формирование аналитических представлений (гистограмма, график, круговая диаграмма)
- Формирование настраиваемых сводных таблиц (с расчетом суммы, количества, среднего, минимального, максимального значения)
- Экспорт представлений в форматы svg, png

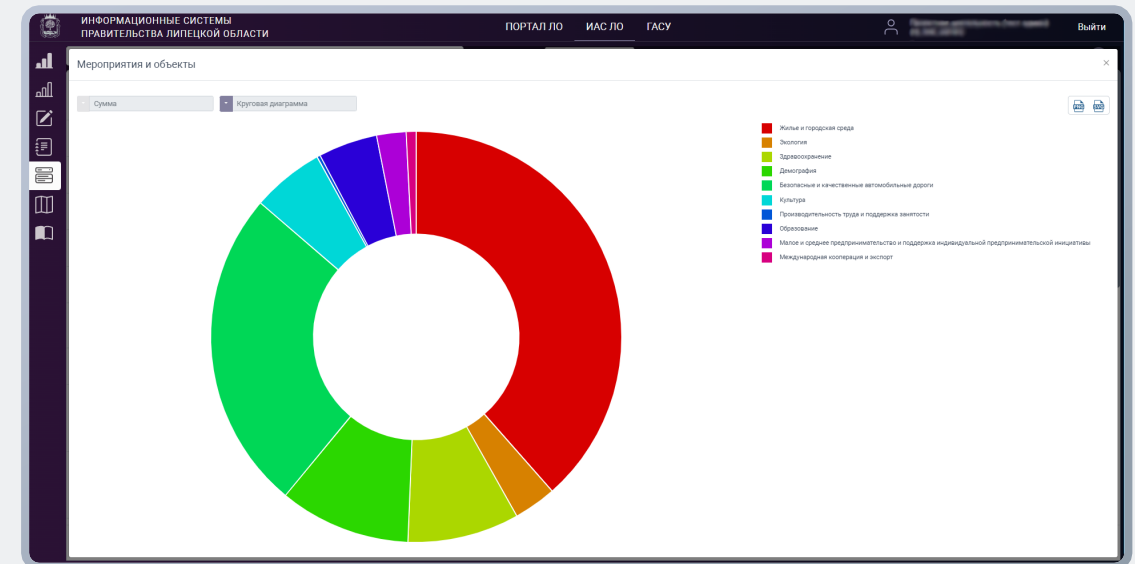

Вопросы?




Поделитесь своими мыслями в чате!

krit

Ждем вас на следующих мероприятиях

Спасибо за внимание!

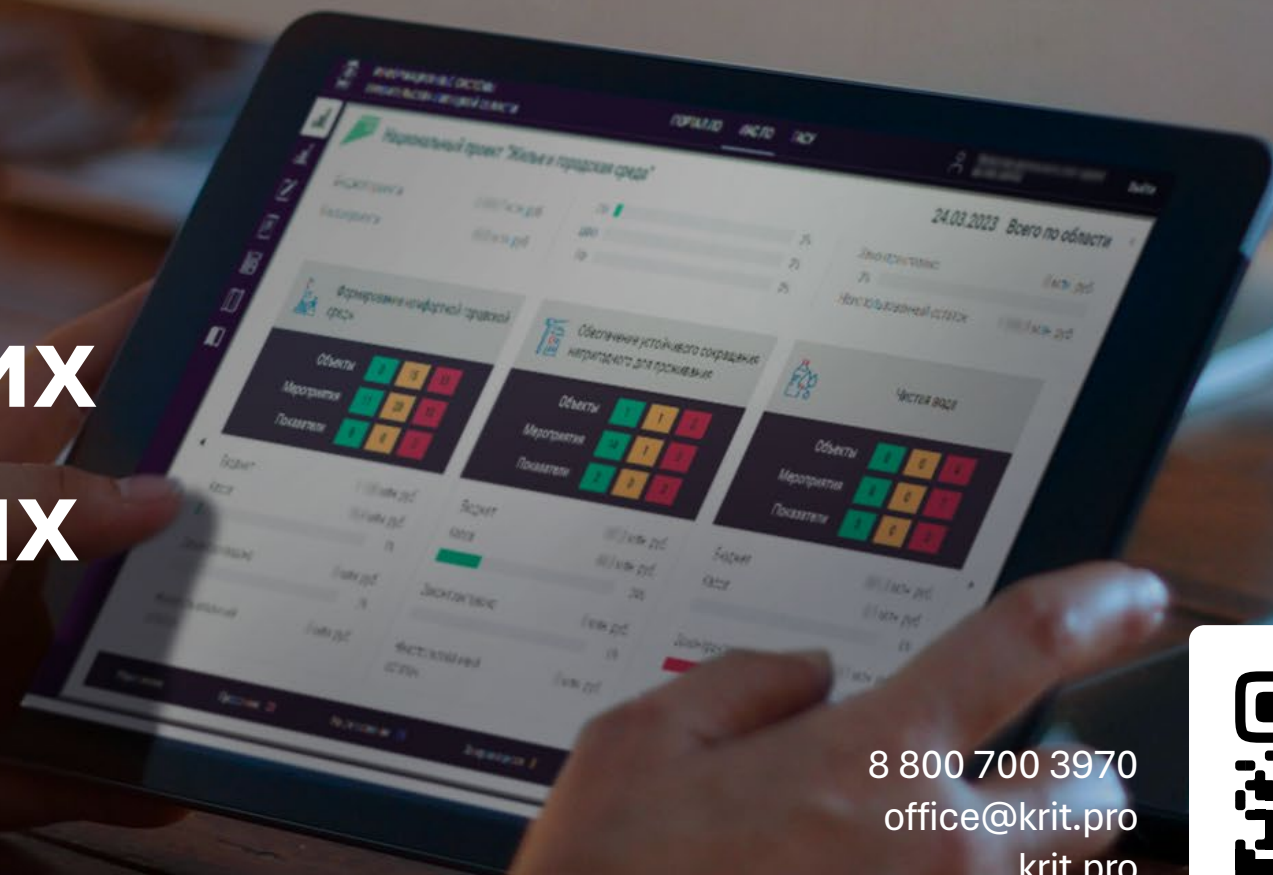

8 800 700 3970
office@krit.pro
krit.pro

